

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
1		FACULTAD DE ARTE TEATRAL- I ETAPA		543 días:	mié 29/11/23	vie 26/12/25	0%		
2		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 5 (PE: 12797252.16)		531 días	mié 29/11/23	mié	1%		
3		FACILIDADES TEMPORALES- SERVIQUIMICA		7 días	mié 29/11/23	vie 08/12/23	44%		
4		Construccion de Cerca Perimetral		6 días	jue 30/11/23	jue 07/12/23	95%		
5		Sum. Tejas Galvanizadas		0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	100%		
6		Iluminacion con Reflectores (incluye cableado y		5 días	mié 29/11/23	mar 05/12/23	0%		
7		Sum. Reflectores		0 días	mié 29/11/23	mié 29/11/23	100%		
8		Sum. Cables, tuberias y accesorios		0 días	mié 29/11/23	mié 29/11/23	100%		
9		Montaje de 3 Garitas-Existe Suministro ISA		2 días	mié 06/12/23	jue 07/12/23	0%		
10		Garantizar Agentes de Seguridad-ISA		0 días	vie 08/12/23	vie 08/12/23	0%		
11		CUBIERTA BLOQUE 5		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
12		[1306] Proceso de Restauracion		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
13		SERVIQUIMICA		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
14		Poroceso de deshumidificacion con barrera		75 días	lun 08/01/24	vie 19/04/24	0%		
15		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	lun 08/01/24	lun 08/01/24	0%		
16		Proceso de eliminacion materiales disgregados en		75 días	lun 26/02/24	vie 07/06/24	0%		
17		Limpieza General con agua a baja presion y con Productos		30 días	lun 27/05/24	vie 05/07/24	0%		
18		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	lun 27/05/24	lun 27/05/24	0%		
19		Prooceso de preconsolidacion de superficies de morteros		42 días	jue 06/06/24	vie 02/08/24	0%		
20		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	jue 06/06/24	jue 06/06/24	0%		
21		Proceso de consolidacion cortical e integracion y		90 días	jue 27/06/24	mié 30/10/24	0%		
22		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
23		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
24		Sum. De Hidrato de Cal (CARACTERISTICAS ESPECIALES) y		0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
25		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado		0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
26		Sum. Ladrillos de barro CARAVISTA		0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
27		Sum. ANDAMIOS en grandes cantidades		0 días	jue 27/06/24	jue 27/06/24	0%		
28		Proceso de impermeabilizacion de cubiertas y canales en		30 días	jue 10/10/24	mié 20/11/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
29		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	jue 10/10/24	jue 10/10/24	0%		
30		Colocacion de rasillas nuevas en cubierta al 100% del area		40 días	jue 17/10/24	mié 11/12/24	0%		
31		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 17/10/24	jue 17/10/24	0%		
32		Proceso de de aplicación de HIDROFOBIZANTE LIQUIDO		20 días	jue 28/11/24	mié 25/12/24	0%		
33		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0%		
34		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de		2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	0%		
35		Sum. Carro de Alta Presion		0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	0%		
36		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y		25 días	mié 17/01/24	mar 20/02/24	0%		
37		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	mié 17/01/24	mié	0%		
38		MUROS INTERIOR		260 días	jue 12/12/24	mié 10/12/25	0%		
39		[1301] Albañileria		240 días	jue 09/01/25	mié 10/12/25	0%		
40		SERVIQUIMICA		28 días	lun 10/03/25	mié 16/04/25	0%		
41		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M		0 días	lun 07/04/25	lun 07/04/25	0%		
42		Sum. Electrodo E360		0 días	lun 07/04/25	lun 07/04/25	0%		
43		Coocacion de muros de bloques de vidrio-10 m2		3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	0%		
44		Sum. Bloques de vidrio de IMPORTACION		0 días	lun 14/04/25	lun 14/04/25	0%		
45		PISOS VARIOS		240 días	jue 09/01/25	mié 10/12/25	0%		
46		Demolicion de pisos de ceramica locales y baños		7 días	mar 02/12/25	mié 10/12/25	0%		
47		Colocacion de pisos de losas de barro 14*28- 255 m2		20 días	jue 09/01/25	mié 05/02/25	0%		
48		Sum. Rasillas-9562 u		0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	0%		
49		Colocacion de pisos de ceramica verde en Baños -25 m2		4 días	jue 06/02/25	mar 11/02/25	0%		
50		Sum. Ceramica color verde de -100 *x-25 m2		0 días	jue 06/02/25	jue 06/02/25	0%		
51		Sum. Rodapie de color verde de -170 ml-IMPORTACION		0 días	jue 06/02/25	jue 06/02/25	0%		
52		Enchape de paredes en baños 300*600 color verde		12 días	mié 12/02/25	jue 27/02/25	0%		
53		Sum. Enchape color verde hierva 300*600 -300		1 día	mié 12/02/25	mié	0%		
54		Sum. Ceramica colorblanco-20 m2- NACIONSAL		0 días	lun 10/03/25	lun 10/03/25	0%		
55		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS		52 días	jue 12/12/24	vie 21/02/25	0%		
56		Colocacion de empotramietos hidrosanitarios en paredes de		20 días	jue 12/12/24	mié 08/01/25	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
57		Colocacion de muebles y Herrajes sanitarios		12 días	jue 06/02/25	vie 21/02/25	0%		
58		Sum. Hidrosanitario 50%	55574.50	0 días	jue 06/02/25	jue 06/02/25	0%		
59		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		20 días	jue 09/01/25	mié 05/02/25	0%		
60		Colocacion de tuberias y cjas electricas empotradas en pared		20 días	jue 09/01/25	mié 05/02/25	0%		
61		Sum. Empotramientos electricos 25%	48319.00	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	0%		
62		TERMINACIONES		27 días	jue 06/02/25	vie 14/03/25	0%		
63		Piuntura impermeable en vigas		3 días	jue 06/02/25	lun 10/02/25	0%		
64		Sum. Pintura impermeable S.SPIRITUS		0 días	jue 06/02/25	jue 06/02/25	0%		
65		Sum. Pintura vinyl en vigas		0 días	jue 06/02/25	jue 06/02/25	0%		
66		Montaje de Carpinteria de aluminio		10 días	mar 11/02/25	lun 24/02/25	0%		
67		Sum, ventanas y puertas de Aluminio IMPORTACION-56 u	163645.00	0 días	mar 11/02/25	mar	0%		
68		Montaje de tuberias electricas canaletas-205 ML		3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	0%		
69		Sum. Canaletas IMPORTACION		0 días	mar 25/02/25	mar 25/02/25	0%		
70		Cableado iluminacion No 14-12-y 16- 500 ml		4 días	vie 28/02/25	mié 05/03/25	0%		
71		Sum. Cables alumbrado y Fuerza IMPORTACION		0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	0%		
72		Montaje de lamparas , luminarias y Accesorios electricos		7 días	jue 06/03/25	vie 14/03/25	0%		
73		Sum. Lamparas y accesorios -95 IMPORTACION		0 días	jue 06/03/25	jue 06/03/25	0%		
74		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 4 (PE:		414	mié 03/01/24	lun 04/08/25	0%		
75		CUBIERTA BLOQUE 4		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
76		[1306] Proceso de Restauracion		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
77		FCBC ARTIMARCO		273 días	mié 03/01/24	vie 17/01/25	0%		
78		Poroceso de deshumidificacion con barrera		75 días	lun 22/01/24	vie 03/05/24	0%		
79		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	lun 22/01/24	lun 22/01/24	0%		
80		Proceso de eliminacion materiales disgregados en		75 días	lun 11/03/24	vie 21/06/24	0%		
81		Limpieza General con agua a baja presion y con Productos		30 días	lun 10/06/24	vie 19/07/24	0%		
82		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	lun 10/06/24	lun 10/06/24	0%		
83		Proceso de preconsolidacion de superficies de morteros		42 días	jue 20/06/24	vie 16/08/24	0%		
84		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	jue 20/06/24	jue 20/06/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
85		Proceso de consolidacion cortical e integracion y		90 días	jue 11/07/24	mié 13/11/24	0%		
86		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
87		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
88		Sum. De Hidrato de Cal (CARACTERISTICAS ESPECIALES) y		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
89		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
90		Sum. Ladrillos de barro CARAVISTA		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
91		Sum. ANDAMIOS en grandes cantidades		0 días	jue 11/07/24	jue 11/07/24	0%		
92		Proceso de impermeabilizacion de cubiertas y canales en		30 días	jue 24/10/24	mié 04/12/24	0%		
93		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	jue 24/10/24	jue 24/10/24	0%		
94		Colocacion de rasillas nuevas en cubierta al 100% del area		40 días	jue 31/10/24	mié 25/12/24	0%		
95		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	0%		
96		Proceso de de aplicación de HIDROFOBIZANTE LIQUIDO		20 días	jue 12/12/24	mié 08/01/25	0%		
97		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0%		
98		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de		25 días	mié 21/02/24	mar 26/03/24	0%		
99		Sum. Carro de Alta Presion		0 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	0%		
100		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y		25 días	mié 27/03/24	mar 30/04/24	0%		
101		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	mié 27/03/24	mié	0%		
102		MUROS		158 días?	jue 26/12/24	lun 04/08/25	0%		
103		[1301] Albañileria		130 días?	jue 26/12/24	mié 25/06/25	0%		
104		ARTIMARCO FCBC		61 días?	mié 02/04/25	mié 25/06/25	0%		
105		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M		4 días	mié 02/04/25	lun 07/04/25	0%		
106		Sum. Electrodo E360		0 días	mié 02/04/25	mié 02/04/25	0%		
107		Cimentacion muros nuevos (incluye encofrado ,		15 días	mar 08/04/25	lun 28/04/25	0%		
108		Colocacion muros de bloques de 0.15		7 días	mar 29/04/25	mié 07/05/25	0%		
109		Enchapes de muros nuevos con ladrillos Cara Vista		25 días	mar 29/04/25	lun 02/06/25	0%		
110		Encofrado y Hormigonado de cerramientos y dinteles		14 días	mar 03/06/25	vie 20/06/25	0%		
111		Coocacion de muros de bloques de vidrio-10 m2		3 días	lun 23/06/25	mié 25/06/25	0%		
112		Sum. Bloques de vidrio de IMPORTACION		1 día?	lun 23/06/25	lun 23/06/25	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
113		PISOS VARIOS		72 días	jue 26/12/24	vie 04/04/25	0%		
114		Demolicion de pisos de ceramica locales y baños		7 días	jue 26/12/24	vie 03/01/25	0%		
115		Colocacion de pisos de losas de barro 14*28- 255 m2		25 días	lun 06/01/25	vie 07/02/25	0%		
116		Sum. Rasillas-9562 u		0 días	lun 06/01/25	lun 06/01/25	0%		
117		Colocacion de pisos de ceramica verde en Baños -25 m2		15 días	lun 10/02/25	vie 28/02/25	0%		
118		Sum. Ceramica color verde de -100 *x-25 m2		0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	0%		
119		Sum. Rodapie de color verde de -170 ml-IMPORTACION		0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	0%		
120		Enchape de paredes en baños 300*600 color verde		25 días	lun 03/03/25	vie 04/04/25	0%		
121		Sum. Enchape color verde hierva 300*600 -300		0 días	lun 03/03/25	lun 03/03/25	0%		
122		Sum. Ceramica colorblanco-20 m2- NACIONSAL		0 días	lun 24/03/25	lun 24/03/25	0%		
123		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS		20 días	lun 06/01/25	vie 31/01/25	0%		
124		Colocacion de empotramietos hidrosanitarios en paredes de		20 días	lun 06/01/25	vie 31/01/25	0%		
125		Sum. Hdrosanitaria Importacion 50%	55 574.50	15 días	lun 06/01/25	vie 24/01/25	0%		
126		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		20 días	lun 03/02/25	vie 28/02/25	0%		
127		Colocacion de tuberias y cjas electricas empotradas en pared		20 días	lun 03/02/25	vie 28/02/25	0%		
128		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	15 días	lun 03/02/25	vie 21/02/25	0%		
129		TERMINACIONES		86 días	lun 07/04/25	lun 04/08/25	0%		
130		Piuntura impermeable en vigas		12 días	lun 07/04/25	mar 22/04/25	0%		
131		Sum. Pintura impermeable S.SPIRITUS		0 días	lun 07/04/25	lun 07/04/25	0%		
132		Sum. Pintura vinyl en vigas		0 días	lun 07/04/25	lun 07/04/25	0%		
133		Montaje de Carpinteria de aluminio		25 días	mié 23/04/25	mar 27/05/25	0%		
134		Sum, ventanas y puertas de Aluminio IMPORTACION-56 u	163645.00	0 días	mié 23/04/25	mié	0%		
135		Montaje de tuberias electricas canaletas-205 ML		7 días	mié 28/05/25	jue 05/06/25	0%		
136		Sum. Canaletas IMPORTACION		0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	0%		
137		Cableado iluminacion No 14-12-y 16- 500 ml		20 días	vie 06/06/25	jue 03/07/25	0%		
138		Sum. Cables alumbrado y Fuerza IMPORTACION		0 días	vie 06/06/25	vie 06/06/25	0%		
139		Montaje de lamparas , luminarias y Accesorios electricos		15 días	vie 04/07/25	jue 24/07/25	0%		
140		Sum. Lamparas y accesorios -95 IMPORTACION		0 días	vie 04/07/25	vie 04/07/25	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
141		CLIMA		7 días	vie 25/07/25	lun 04/08/25	0%		
142		Montaje de tub. Climas		7 días	vie 25/07/25	lun 04/08/25	0%		
143		Sum. EQUIPOS DE CLIMA -SPLIT - 8 U		0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	0%		
144		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 10 PE:		501	lun 15/01/24	lun 15/12/25	0%		
145		CUBIERTA BLOQUE 10- ARTIMARCO FCBC		501 días	lun 15/01/24	lun 15/12/25	0%		
146		[1306] Proceso de Restauracion		501 días	lun 15/01/24	lun 15/12/25	0%		
147		SERVIQUIMICA		501 días	lun 15/01/24	lun 15/12/25	0%		
148		Porceso de deshumidificacion con barrera		75 días	jue 26/12/24	mié 09/04/25	0%		
149		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>	67317.75	0 días	jue 26/12/24	jue 26/12/24	0%		
150		Proceso de eliminacion materiales disgregados en		75 días	jue 13/02/25	mié 28/05/25	0%		
151		Limpieza General con agua a baja presion y con Productos		30 días	jue 15/05/25	mié 25/06/25	0%		
152		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>	27819.13	0 días	jue 15/05/25	jue 15/05/25	0%		
153		<i>Proceso de preconsolidacion de superficies de morteros</i>		42 días	mar 27/05/25	mié 23/07/25	0%		
154		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>	27819.13	0 días	mar 27/05/25	mar	0%		
155		Proceso de consolidacion cortical e integracion y		90 días	mar 17/06/25	lun 20/10/25	0%		
156		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>	67317.75	0 días	mar 17/06/25	mar	0%		
157		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
158		Sum. De Hidrato de Cal (CARACTERISTICAS ESPECIALES) y		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
159		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
160		Sum. Ladrillos de barro CARAVISTA		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
161		Sum. ANDAMIOS en grandes cantidades		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
162		Proceso de impermeabilizacion de cubiertas y canales en		30 días	mar 30/09/25	lun 10/11/25	0%		
163		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>		0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	0%		
164		Colocacion de rasillas nuevas en cubierta al 100% del area		40 días	mar 07/10/25	lun 01/12/25	0%		
165		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mar 07/10/25	mar 07/10/25	0%		
166		Proceso de de aplicación de HIDROFOBIZANTE LIQUIDO		20 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25	0%		
167		<i>Suministro de productos quimicos de restauracion , y</i>		0 días	mar 18/11/25	mar	0%		
168		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de		2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
169		Sum. Carro de Alta Presion		0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	0%		
170		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y		25 días	mié 17/01/24	mar 20/02/24	0%		
171		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	mié 17/01/24	mié	0%		
172		INTERIOR TECHOS		26 días	lun 12/05/25	lun 16/06/25	0%		
173		[1306] Impermeabilizaciones		26 días	lun 12/05/25	lun 16/06/25	0%		
174		SERVIQUIMICA		26 días	lun 12/05/25	lun 16/06/25	0%		
175		MUROS		32 días?	mar 17/06/25	mié 30/07/25	0%		
176		[1301] Albañileria		28 días?	mar 17/06/25	jue 24/07/25	0%		
177		SERVIQUIMICA		28 días?	mar 17/06/25	jue 24/07/25	0%		
178		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M		4 días	mié 09/07/25	lun 14/07/25	0%		
179		Sum. Electrodo E360		0 días	mié 09/07/25	mié 09/07/25	0%		
180		PISOS VARIOS		14 días	mar 17/06/25	vie 04/07/25	0%		
181		Demolicion de pisos de ceramica locales y baños		7 días	mar 17/06/25	mié 25/06/25	0%		
182		Colocacion de pisos de losas de barro 14*28- 255 m2		7 días	jue 26/06/25	vie 04/07/25	0%		
183		Sum. Rasillas-9562 u		0 días	jue 26/06/25	jue 26/06/25	0%		
184		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		12 días	mar 15/07/25	mié 30/07/25	0%		
185		Colocacion de tuberias y cjas electricas empotradas en pared					0%		
186		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	12 días	mar 15/07/25	mié 30/07/25	0%		
187		TERMINACIONES		24 días	mar 17/06/25	vie 18/07/25	0%		
188		Piuntura impermeable en vigas		3 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	0%		
189		Sum. Pintura impermeable S.SPIRITUS		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
190		Sum. Pintura vinyl en vigas		0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0%		
191		Montaje de Carpinteria de aluminio		7 días	vie 20/06/25	lun 30/06/25	0%		
192		Sum, ventanas y puertas de Aluminio IMPORTACION-56 u	163645.00	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	0%		
193		Montaje de tuberias electricas canaletas-205 ML		3 días	mar 01/07/25	jue 03/07/25	0%		
194		Sum. Canaletas IMPORTACION		0 días	mar 01/07/25	mar 01/07/25	0%		
195		Cableado iluminacion No 14-12-y 16- 500 ml		4 días	vie 04/07/25	mié 09/07/25	0%		
196		Sum. Cables alumbrado y Fuerza IMPORTACION		0 días	vie 04/07/25	vie 04/07/25	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
197		Montaje de lamparas , luminarias y Accesorios electricos		7 días	jue 10/07/25	vie 18/07/25	0%		
198		Sum. Lamparas y accesorios -95 IMPORTACION		0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	0%		
199		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 11(PE:		524	mié 29/11/23	lun 01/12/25	0%		
200		CUBIERTA BLOQUE 10- ARTIMARCO FCBC		491 días	lun 15/01/24	lun 01/12/25	0%		
201		[1306] Proceso de Restauracion		491 días	lun 15/01/24	lun 01/12/25	0%		
202		SERVIQUIMICA		491 días	lun 15/01/24	lun 01/12/25	0%		
203		Poroceso de deshumidificacion con barrera		75 días	jue 12/12/24	mié 26/03/25	0%		
204		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0%		
205		Proceso de eliminacion materiales disgregados en		75 días	jue 30/01/25	mié 14/05/25	0%		
206		Limpieza General con agua a baja presion y con Productos		30 días	jue 01/05/25	mié 11/06/25	0%		
207		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	67317.75	0 días	jue 01/05/25	jue 01/05/25	0%		
208		Proeceso de preconsolidacion de superficies de morteros		42 días	mar 13/05/25	mié 09/07/25	0%		
209		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	mar 13/05/25	mar	0%		
210		Proceso de consolidacion cortical e integracion y		90 días	mar 03/06/25	lun 06/10/25	0%		
211		Suministro de productos quimicos de restauracion , y	27819.13	0 días	mar 03/06/25	mar	0%		
212		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mar 03/06/25	mar 03/06/25	0%		
213		Sum. De Hidrato de Cal (CARACTERISTICAS ESPECIALES) y		0 días	mar 03/06/25	mar 03/06/25	0%		
214		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado		0 días	mar 03/06/25	mar 03/06/25	0%		
215		Sum. Ladrillos de barro CARAVISTA		0 días	mar 03/06/25	mar 03/06/25	0%		
216		Sum. ANDAMIOS en grandes cantidades		0 días	mar 03/06/25	mar 03/06/25	0%		
217		Proceso de impermeabilizacion de cubiertas y canales en		30 días	mar 16/09/25	lun 27/10/25	0%		
218		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	0%		
219		Colocacion de rasillas nuevas en cubierta al 100% del area		40 días	mar 23/09/25	lun 17/11/25	0%		
220		Sum. De Rasillas (en obra)		0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	0%		
221		Proceso de de aplicación de HIDROFOBIZANTE LIQUIDO		20 días	mar 04/11/25	lun 01/12/25	0%		
222		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	mar 04/11/25	mar	0%		
223		Limpieza y destupicion de Bajantes Pluviales con carro de		2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	0%		
224		Sum. Carro de Alta Presion		0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
225		Reparacion de Bajantes Pluviales (incluye destupicion y		25 días	mié 17/01/24	mar 20/02/24	0%		
226		Sum. Productos restauradores de B.P-IMPORTACION		0 días	mié 17/01/24	mié	0%		
227		INTERIOR TECHOS		365 días	mié 29/11/23	mar 22/04/25	0%		
228		[1306] Impermeabilizaciones		365 días	mié 29/11/23	mar 22/04/25	0%		
229		SERVIQUIMICA		365 días	mié 29/11/23	mar 22/04/25	0%		
230		MUROS		451 días?	vie 08/12/23	vie 29/08/25	0%		
231		[1301] Albañileria		16 días	mar 03/09/24	mar 24/09/24	0%		
232		SERVIQUIMICA		16 días	mar 03/09/24	mar 24/09/24	0%		
233		PISOS VARIOS		14 días	mar 12/08/25	vie 29/08/25	0%		
234		Demolicion de pisos de ceramica locales y baños		7 días	lun 12/08/24	mar 20/08/24	0%		
235		Colocacion de pisos de losas de barro 14*28- 255 m2		7 días	mié 21/08/24	jue 29/08/24	0%		
236		Sum. Rasillas-9562 u		0 días	vie 08/12/23	vie 08/12/23	0%		
237		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		1 día?	lun 20/05/24	lun 20/05/24	0%		
238		Colocacion de tuberias y cjas electricas empotradas en pared					0%		
239		Sum. Empotramientos electricos	48319.00	0 días	lun 20/05/24	lun 20/05/24	0%		
240		TERMINACIONES		133 días	mié 04/09/24	vie 07/03/25	0%		
241		Piuntura impermeable en vigas		10 días	mar 18/02/25	lun 03/03/25	0%		
242		Sum. Pintura impermeable S.SPIRITUS		0 días	mar 18/02/25	mar 18/02/25	0%		
243		Sum. Pintura vinyl en vigas		0 días	lun 09/12/24	lun 09/12/24	0%		
244		Montaje de Carpinteria de aluminio		25 días	jue 12/12/24	mié 15/01/25	0%		
245		Sum, ventanas y puertas de Aluminio IMPORTACION-56 u	163645.00	0 días	mié 04/09/24	mié	0%		
246		Montaje de tuberias electricas canaletas-205 ML		10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	0%		
247		Sum. Canaletas IMPORTACION		0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	0%		
248		Cableado iluminacion No 14-12-y 16- 500 ml		7 días	jue 30/01/25	vie 07/02/25	0%		
249		Sum. Cables alumbrado y Fuerza IMPORTACION		0 días	mar 21/01/25	mar 21/01/25	0%		
250		Montaje de lamparas , luminarias y Accesorios electricos		20 días	lun 10/02/25	vie 07/03/25	0%		
251		Sum. Lamparas y accesorios -95 IMPORTACION		0 días	lun 27/01/25	lun 27/01/25	0%		
252		FACHADAS VARIAS		410 días	lun 03/06/24	vie 26/12/25	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
253		Montaje de andamios en Fachadas H= 10 mts EN GRANDES		20 días	lun 03/06/24	vie 28/06/24	0%		
254		Poroceso de deshumidificacion con barrera quimica,desinfeccion		90 días	jue 05/09/24	mié 08/01/25	0%		
255		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	jue 05/09/24	jue 05/09/24	0%		
256		Proceso de eliminacion materiales disgregados en ladrillos y		80 días	jue 09/01/25	mié 30/04/25	0%		
257		Limpieza General con agua a baja presion y con Productos		30 días	jue 01/05/25	mié 11/06/25	0%		
258		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	jue 01/05/25	jue 01/05/25	0%		
259		Proeceso de preconsolidacion de superficies de , ladrillos y		30 días	jue 12/06/25	mié 23/07/25	0%		
260		Suministro de productos quimicos de restauracion , y		0 días	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0%		
261		Proceso de consolidacion cortical e integracion y rejuntado		80 días	jue 24/07/25	mié 12/11/25	0%		
262		Proceso de de aplicación de HIDROFOBIZANTE LIQUIDO en		10 días	jue 13/11/25	mié 26/11/25	0%		
263		Sum. Productos Quimicos IMPORTACION		0 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25	0%		
264		Pintura en pretilas		12 días	jue 27/11/25	vie 12/12/25	0%		
265		Sum. Pintura impermeable S.SPIRITUS		0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	0%		
266		Desarme de andamios		10 días	lun 15/12/25	vie 26/12/25	0%		
267		AREAS EXTERIORES		242 días	lun 12/08/24	mar 15/07/25	0%		
268		Viales		107 días	lun 17/02/25	mar 15/07/25	0%		
269		Construccion de escalera de Hormigon Bloque 5 y 4- 2u		25 días	lun 17/02/25	vie 21/03/25	0%		
270		Construccion de drenes pluviales (lecho de gravilla)		12 días	lun 24/03/25	mar 08/04/25	0%		
271		Construccion de Aceras de Hormigon		15 días	mié 09/04/25	mar 29/04/25	0%		
272		Mov. De Tierra para nuevo vial		10 días	mié 30/04/25	mar 13/05/25	0%		
273		Hormigon en pavimento vial -Rbk= 250 kg/cm2..		25 días	mié 14/05/25	mar 17/06/25	0%		
274		Restauracion areas Verdes y jardineria		20 días	mié 18/06/25	mar 15/07/25	0%		
275		TANQUE ELEVADO		60 días	lun 12/08/24	vie 01/11/24	0%		
276		Reparacion y recrecimiento estructural de Muros		35 días	lun 12/08/24	vie 27/09/24	0%		
277		Confeccion de tapa y fondo de Hormigon prefabricado en		25 días	lun 30/09/24	vie 01/11/24	0%		
278							0%		
279		Analisis presupuestario Bloques 4,5,10 y 11		292 días	lun 08/04/24	mar 20/05/25	0%		
280		TOTAL EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	111 149.00	0 días	lun 15/04/24	lun 15/04/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
281	★	TOTAL EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS	193 276.00	0 días	lun 20/05/24	lun 20/05/24	0%		
282	★	TOTAL CARPINTERIA Y ENCHAPE	654 580.00	0 días	jue 08/05/25	jue 08/05/25	0%		
283	★	TOTAL Sum. De Productos Quimicos de Importacion MUROS	538 542.00	0 días	lun 08/04/24	lun 08/04/24	0%		
284	★	Sum. De productos de restauracion CUBIERTAS IMPORTACION	222 553.00	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24	0%		
285	★	TOTAL EUROS 1RA PARTIDA	1 720 000.00	0 días	mié 29/11/23	mié 29/11/23	0%		
286	🚧								
287	🚧	RED HIDRAULICA EXTERIOR PVC		26 días?	lun 25/03/24	lun 29/04/24	0%		
288	★	Excavacion en zanja manual		5 días	lun 25/03/24	vie 29/03/24	0%		
289	★	Lecho de gravilla en zanja		3 días	lun 01/04/24	mié 03/04/24	0%		
290	★	Colocacion tuberia 75 mm en zanja		12 días	jue 04/04/24	vie 19/04/24	0%		
291	★	Sum. De tuberias Hidraulica PVC Y Accesorios		0 días	jue 04/04/24	jue 04/04/24	0%		
292	🚧	Construccion de Registros de Bloquer 0.15		15 días	lun 08/04/24	vie 26/04/24	0%		
293	🚧	Rehincho en zanja manual		1 día?	lun 29/04/24	lun 29/04/24	0%		
294	🚧	RED EXTERIOR corrientes debiles (SACI,SAD y VOZ Y		106 días	mié 28/02/24	mié	0%		
295	🚧	Excavacion en zanja manual		5 días	mar 30/04/24	lun 06/05/24	0%		
296	🚧	Lecho de gravilla en zanja		3 días	mar 07/05/24	jue 09/05/24	0%		
297	🚧	Colocacion tuberia 75 mm en zanja		12 días	vie 10/05/24	lun 27/05/24	0%		
298	🚧	Sum. Tuberia 50 mm		0 días	vie 10/05/24	vie 10/05/24	0%		
299	🚧	Construccion de Registros de Bloquer 0.15		10 días	mar 28/05/24	lun 10/06/24	0%		
300	🚧	Rehincho en zanja manual		2 días	mar 11/06/24	mié 12/06/24	0%		
301	🚧	Cableado de los Sistemas y conexiones		30 días	jue 13/06/24	mié 24/07/24	0%		
302	★	SuMM. Y ejecucion de cables Corrientes 'SEISA		0 días	mié 28/02/24	mié 28/02/24	0%		
303	★	POZO DE INFILTRACION Y REDES EXTERIORES		86.5	lun 22/01/24	mar	0%		
304	★	Excavacion en tierra mecanizada		2 días	lun 22/01/24	mar 23/01/24	0%		
305	★	Nivelacion manual de fondo y paredes de tierra		1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24	0%		
306	★	Encofrado sello nivelacion fondo		1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24	0%		
307	★	Hormigon sello nivelacion Rbk=150 kg/cm2		1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24	0%		
308	★	Encofrado lateral guarderas de fondo...24ml		1 día	mar 23/01/24	mar 23/01/24	0%		


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
309	★	Elab. Y colocacion acero BR 12 mm		1 día	mié 24/01/24	mié 24/01/24	0%		
310	★	Hgon Losa de fondo kg/cm2Rbk=250		1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24	0%		
311	★	Colocacion muro bloque 0.20 macizado con Hgon =100kg/cm2 y		1 día	vie 26/01/24	vie 26/01/24	0%		
312	★	Encofrado cerramento losa cubierta-...28ml		1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24	0%		
313	★	Elab. Y Colocacion de acero de 10 y 12 mm en cerramento		1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24	0%		
314	★	Hgon cerramento Rbk= 250 kg/cm2		1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24	0%		
315	★	Encofrado losa cubierta		1 día	mar 30/01/24	mar 30/01/24	0%		
316	★	Elab. Y colocacion acero 10 y 12 mm en losa cubierta		1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24	0%		
317	★	Hgon en losa de cubierta Rbk=250 kg-incluye insertos de angular p		0.5 días	mié 31/01/24	mié 31/01/24	0%		
318	★	Montaje de Tapa metalica 60*60 prefabricada		1 día	mié 31/01/24	jue 01/02/24	0%		
319	★	Pintura asfaltica en paredes exteriores		1 día	jue 01/02/24	vie 02/02/24	0%		
320	★	Rehicho mecanizado		1 día	vie 02/02/24	lun 05/02/24	0%		
321	★	RED SANITARIA EXTERIOR		76 días	lun 05/02/24	mar 21/05/24	0%		
322	★	RED ZONA SUR RAMAL Interior		19 días	lun 05/02/24	vie 01/03/24	0%		
323	★	Excavacion en zanja (800*800mm)....85 ml		3 días	lun 05/02/24	jue 08/02/24	0%		
324	★	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)		3 días	jue 08/02/24	mar 13/02/24	0%		
325	★	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC		4 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24	0%		
326	★	Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC		0 días	mar 13/02/24	mar 13/02/24	0%		
327	★	Rehicho en zanja manual		3 días	lun 19/02/24	jue 22/02/24	0%		
328	★	Construccion de registros de bloques de 0.15* 0.6*0.6 interior		5 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	0%		
329	★	Colocacion de tapas de registros de hgon		1 día	jue 29/02/24	vie 01/03/24	0%		
330	★	RED ZONA SUR RAMAL Exterior		19 días	vie 01/03/24	jue 28/03/24	0%		
331	★	Excavacion en zanja (800*800mm)....120 ml		3 días	vie 01/03/24	mié 06/03/24	0%		
332	★	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)		3 días	mié 06/03/24	lun 11/03/24	0%		
333	★	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC		4 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24	0%		
334	★	Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC		0 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	0%		
335	★	Rehicho en zanja manual		3 días	vie 15/03/24	mié 20/03/24	0%		
336	★	Construccion de registros de bloques de 0.15* 0.6*0.6 interior		5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	0%		


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% comple	julio	
								02/07	03/09
337	★	Colocacion de tapas de registros de hgon		1 día	mié 27/03/24	jue 28/03/24	0%		
338	★	RED ZONA NORTE		19 días	jue 28/03/24	mié 24/04/24	0%		
339	★	Excavacion en zanja (800*800mm)...81 ml		3 días	jue 28/03/24	mar 02/04/24	0%		
340	★	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)		3 días	mar 02/04/24	vie 05/04/24	0%		
341	★	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC		4 días	vie 05/04/24	jue 11/04/24	0%		
342	★	Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC		0 días	vie 05/04/24	vie 05/04/24	0%		
343	★	Rehincho en zanja manual		3 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	0%		
344	★	Construccion de registros de bloques de 0.15* 0.6*0.6 interior		5 días	mar 16/04/24	mar 23/04/24	0%		
345	★	Colocacion de tapas de registros de hgon		1 día	mar 23/04/24	mié 24/04/24	0%		
346	★	RED ZONA LINEA CENTRAL A TANQUE SEPTICO		19 días	mié 24/04/24	mar 21/05/24	0%		
347	★	Excavacion en zanja (800*800mm)...50 ml		3 días	mié 24/04/24	lun 29/04/24	0%		
348	★	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)		3 días	lun 29/04/24	jue 02/05/24	0%		
349	★	Colocacion tuberia Sanitaria 150 mm PVC		4 días	jue 02/05/24	mié 08/05/24	0%		
350	★	Sum. Tuberia Sanitaria 150 mm PVC		0 días	jue 02/05/24	jue 02/05/24	0%		
351	★	Rehincho en zanja manual		3 días	mié 08/05/24	lun 13/05/24	0%		
352	★	Construccion de registros de bloques de 0.15* 0.6*0.6 interior		5 días	lun 13/05/24	lun 20/05/24	0%		
353	★	Colocacion de tapas de registros de hgon		1 día	lun 20/05/24	mar 21/05/24	0%		


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

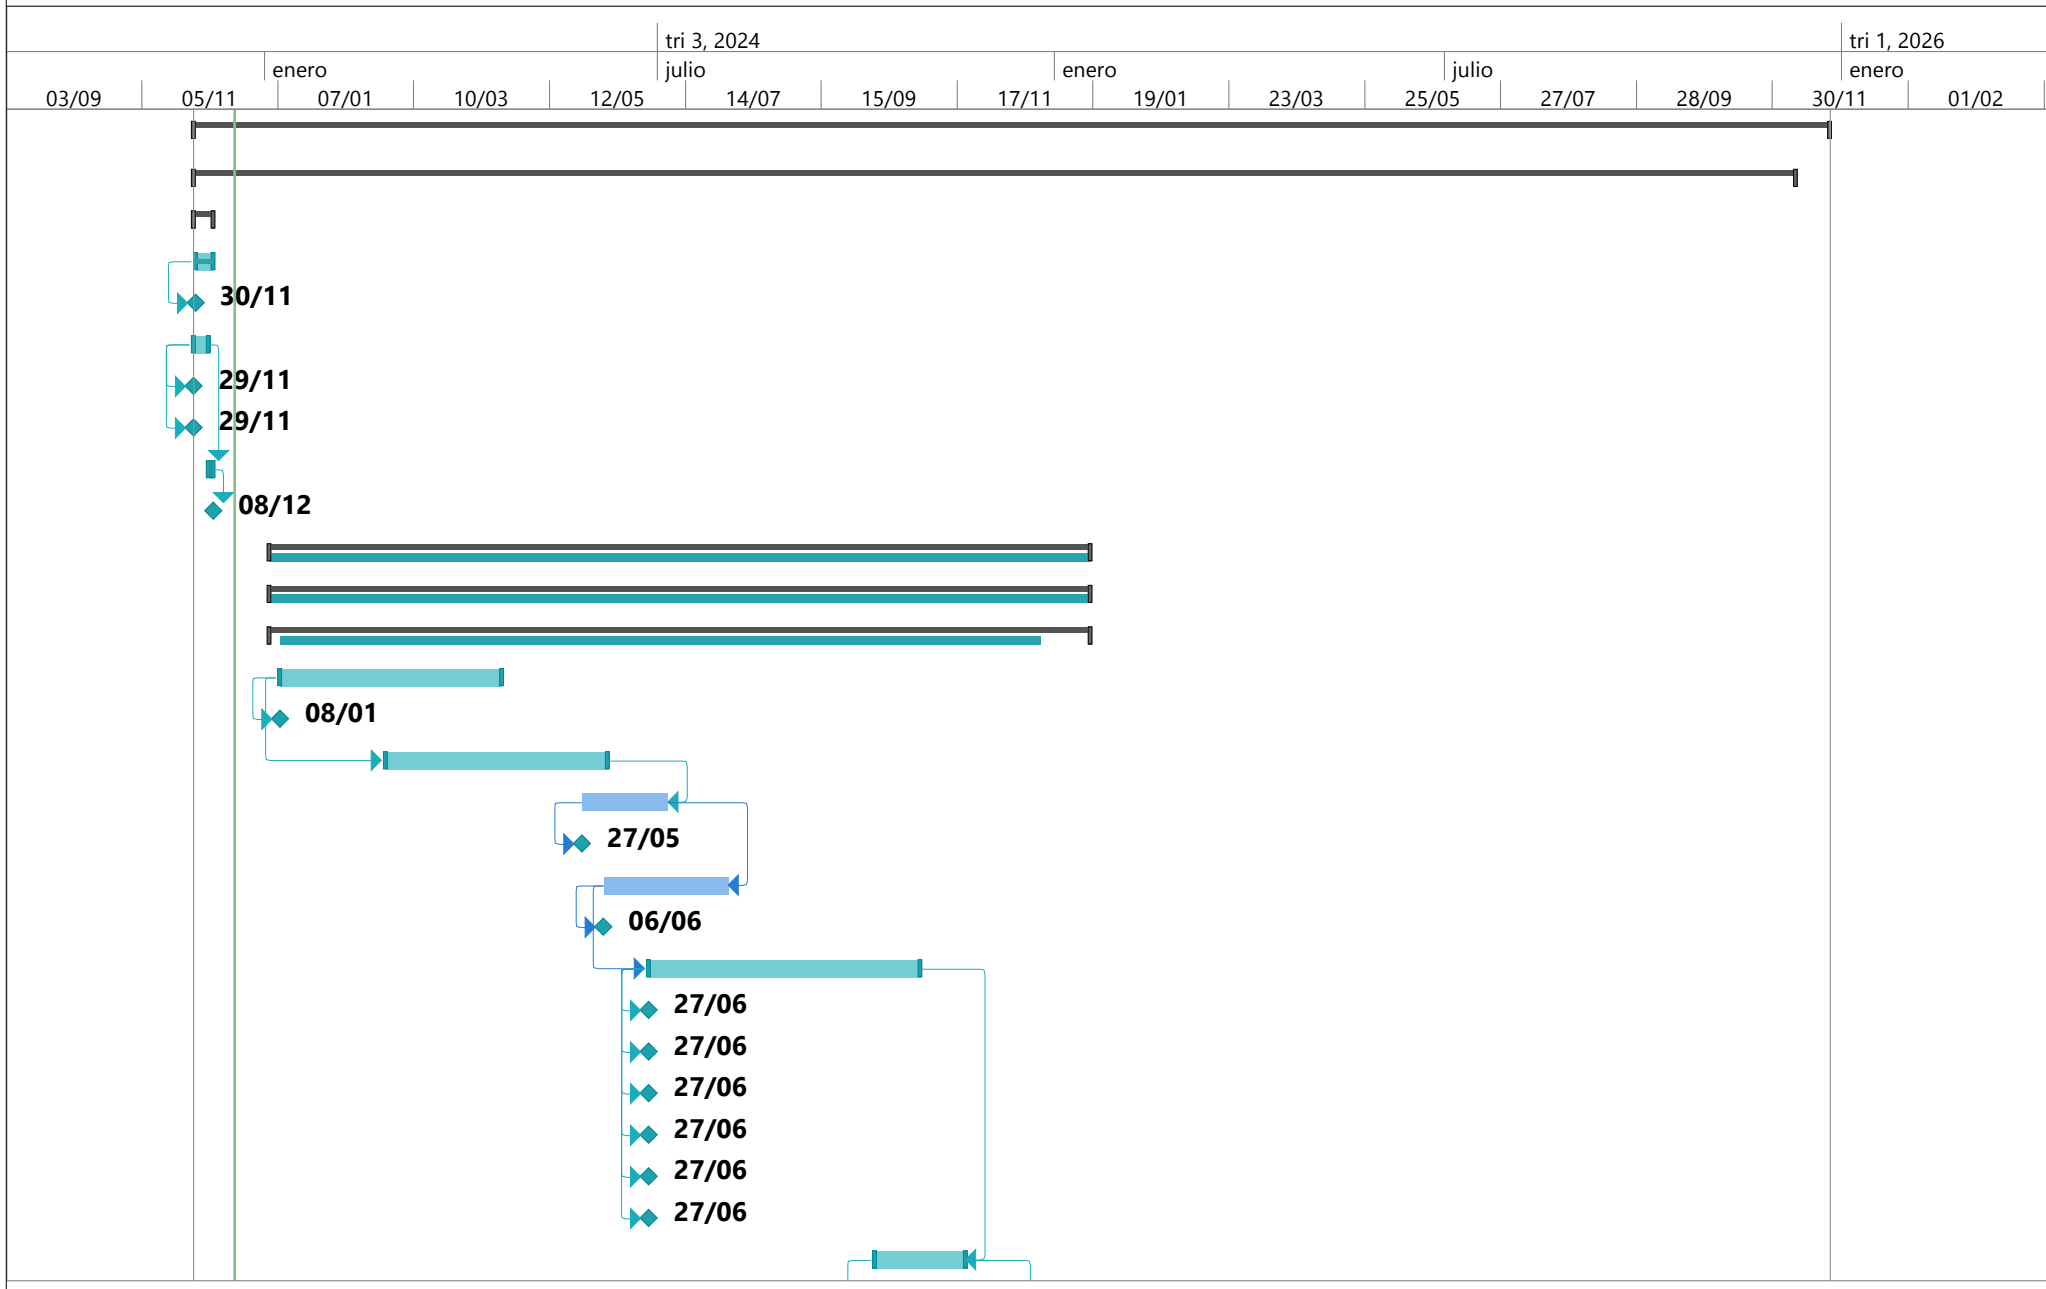


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

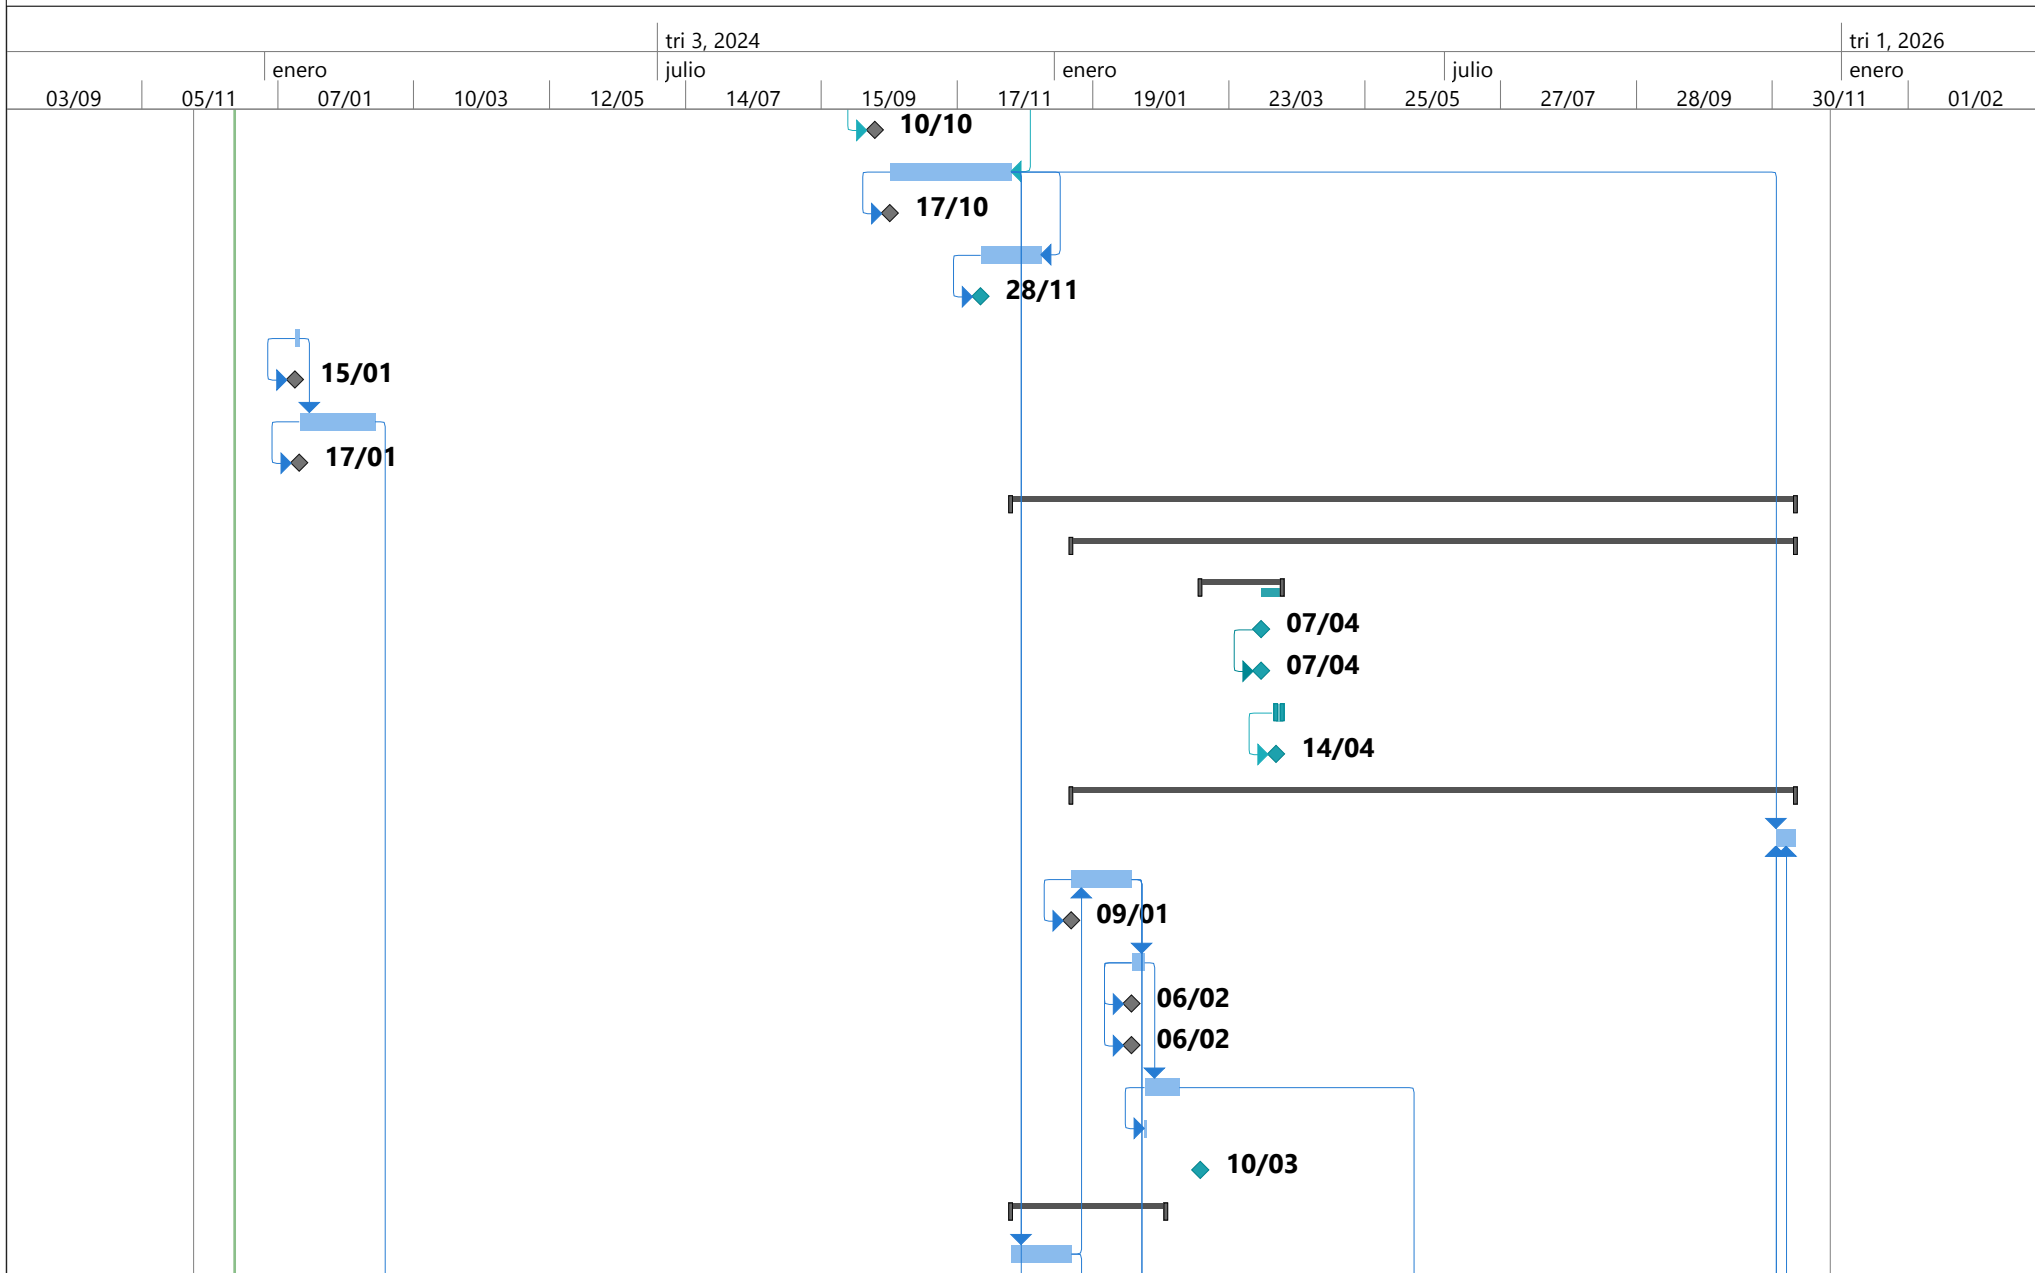


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

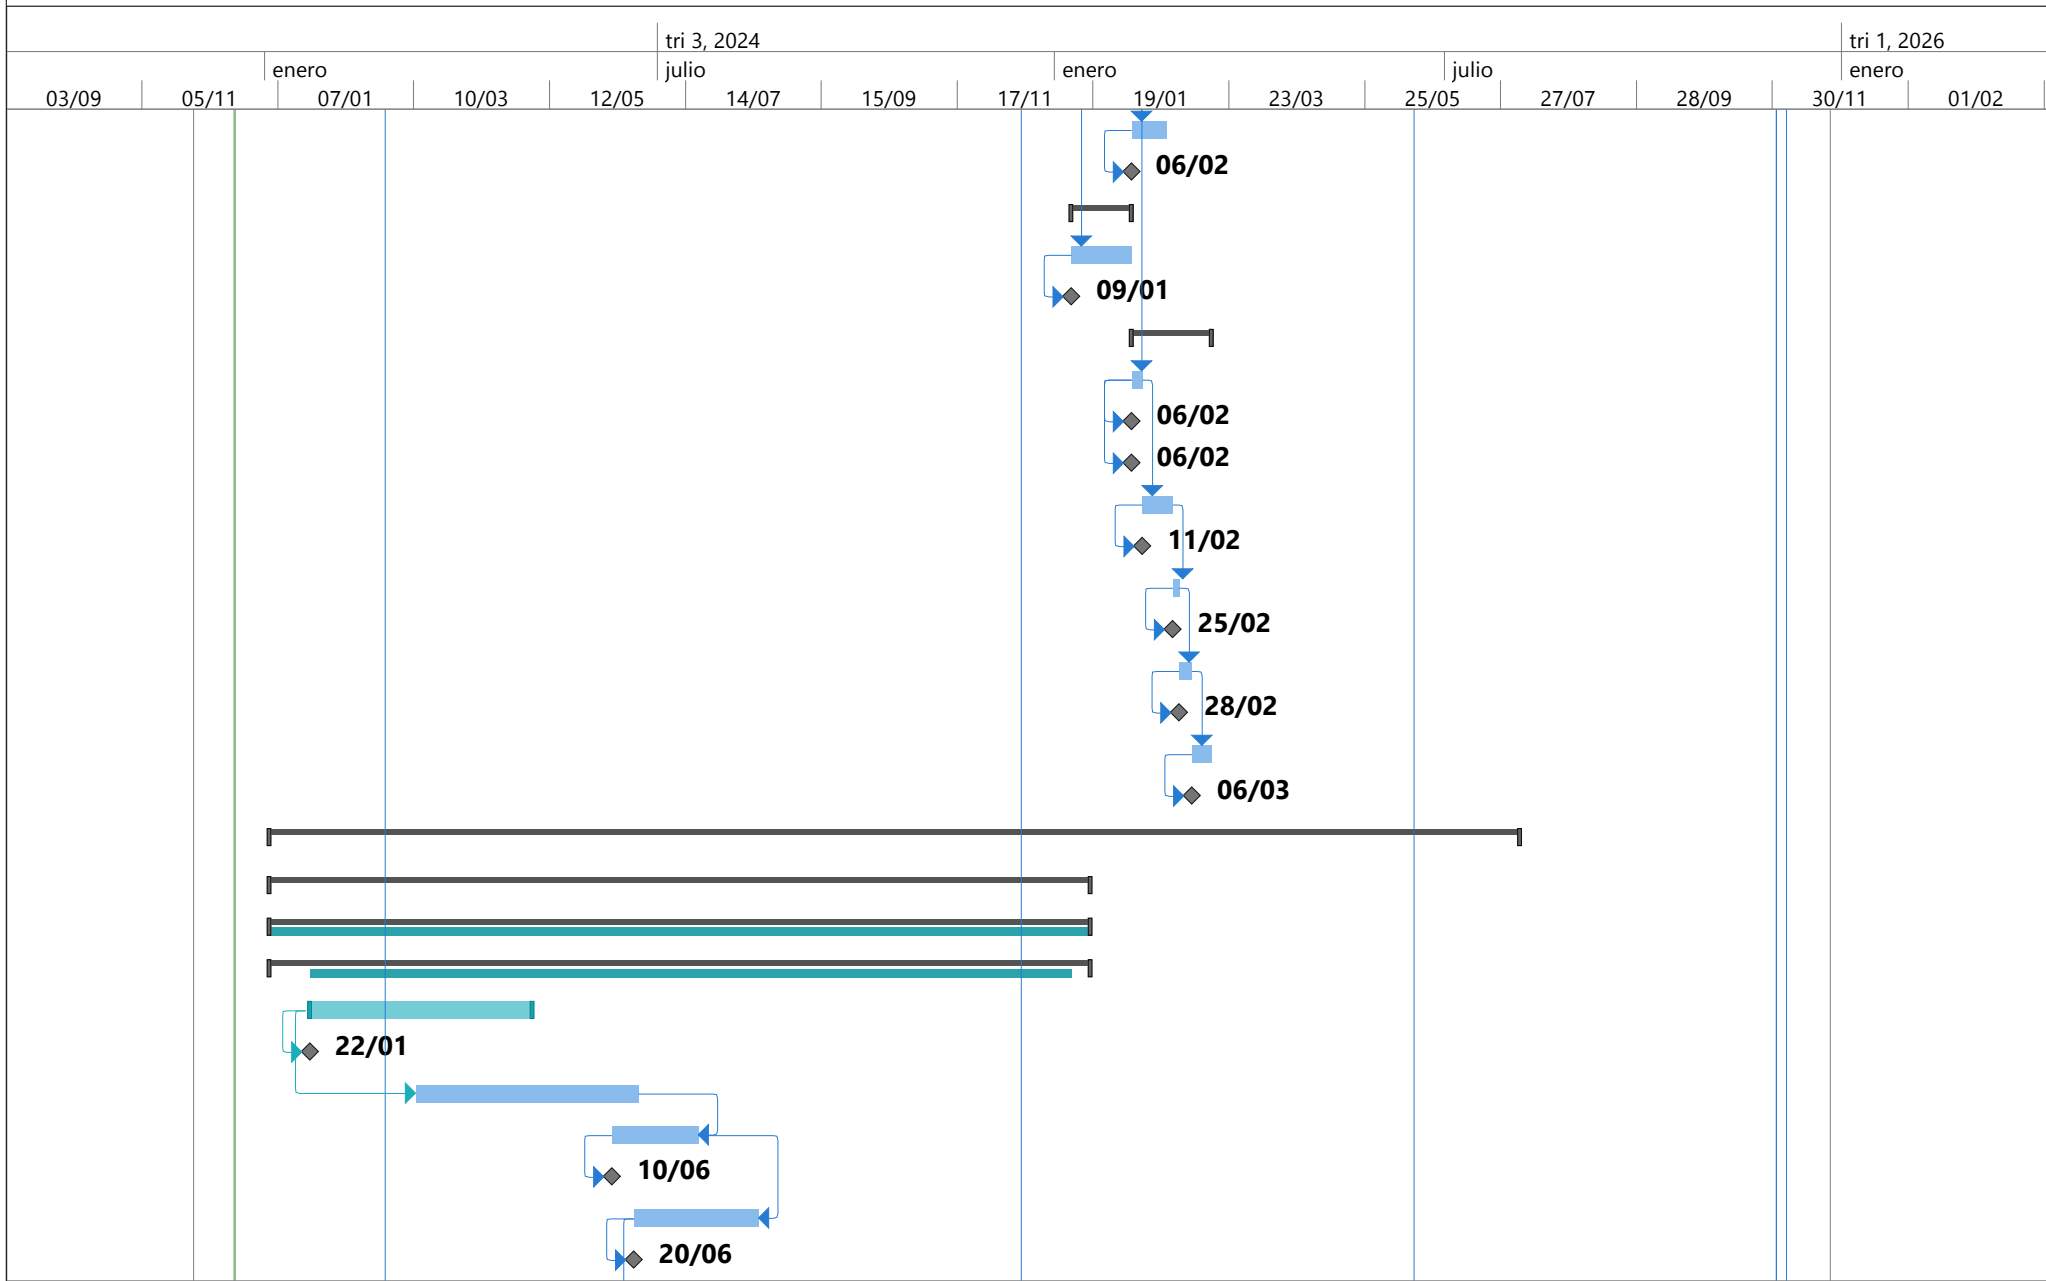


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

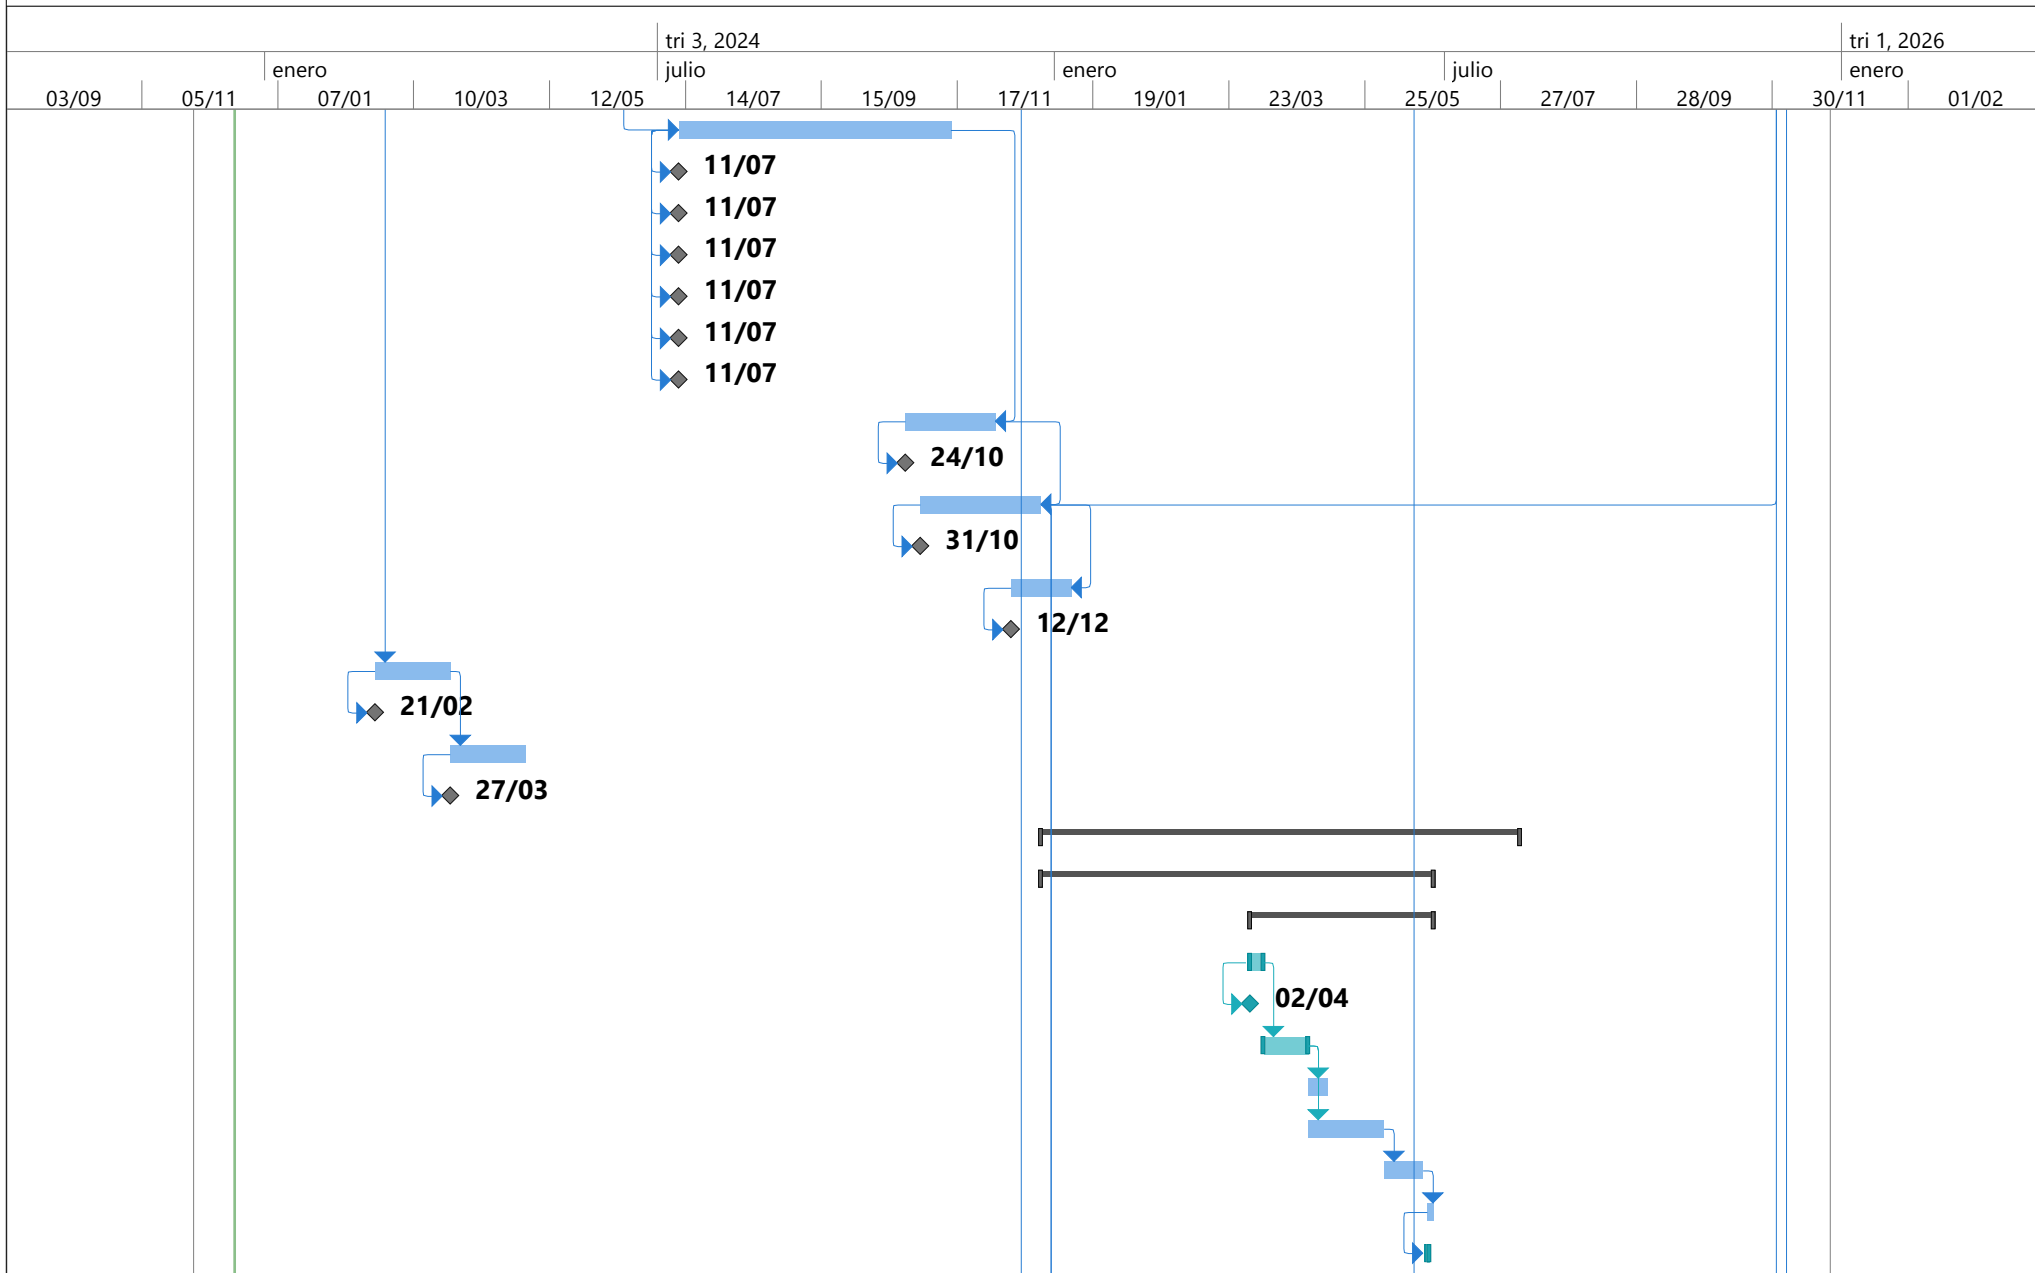


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

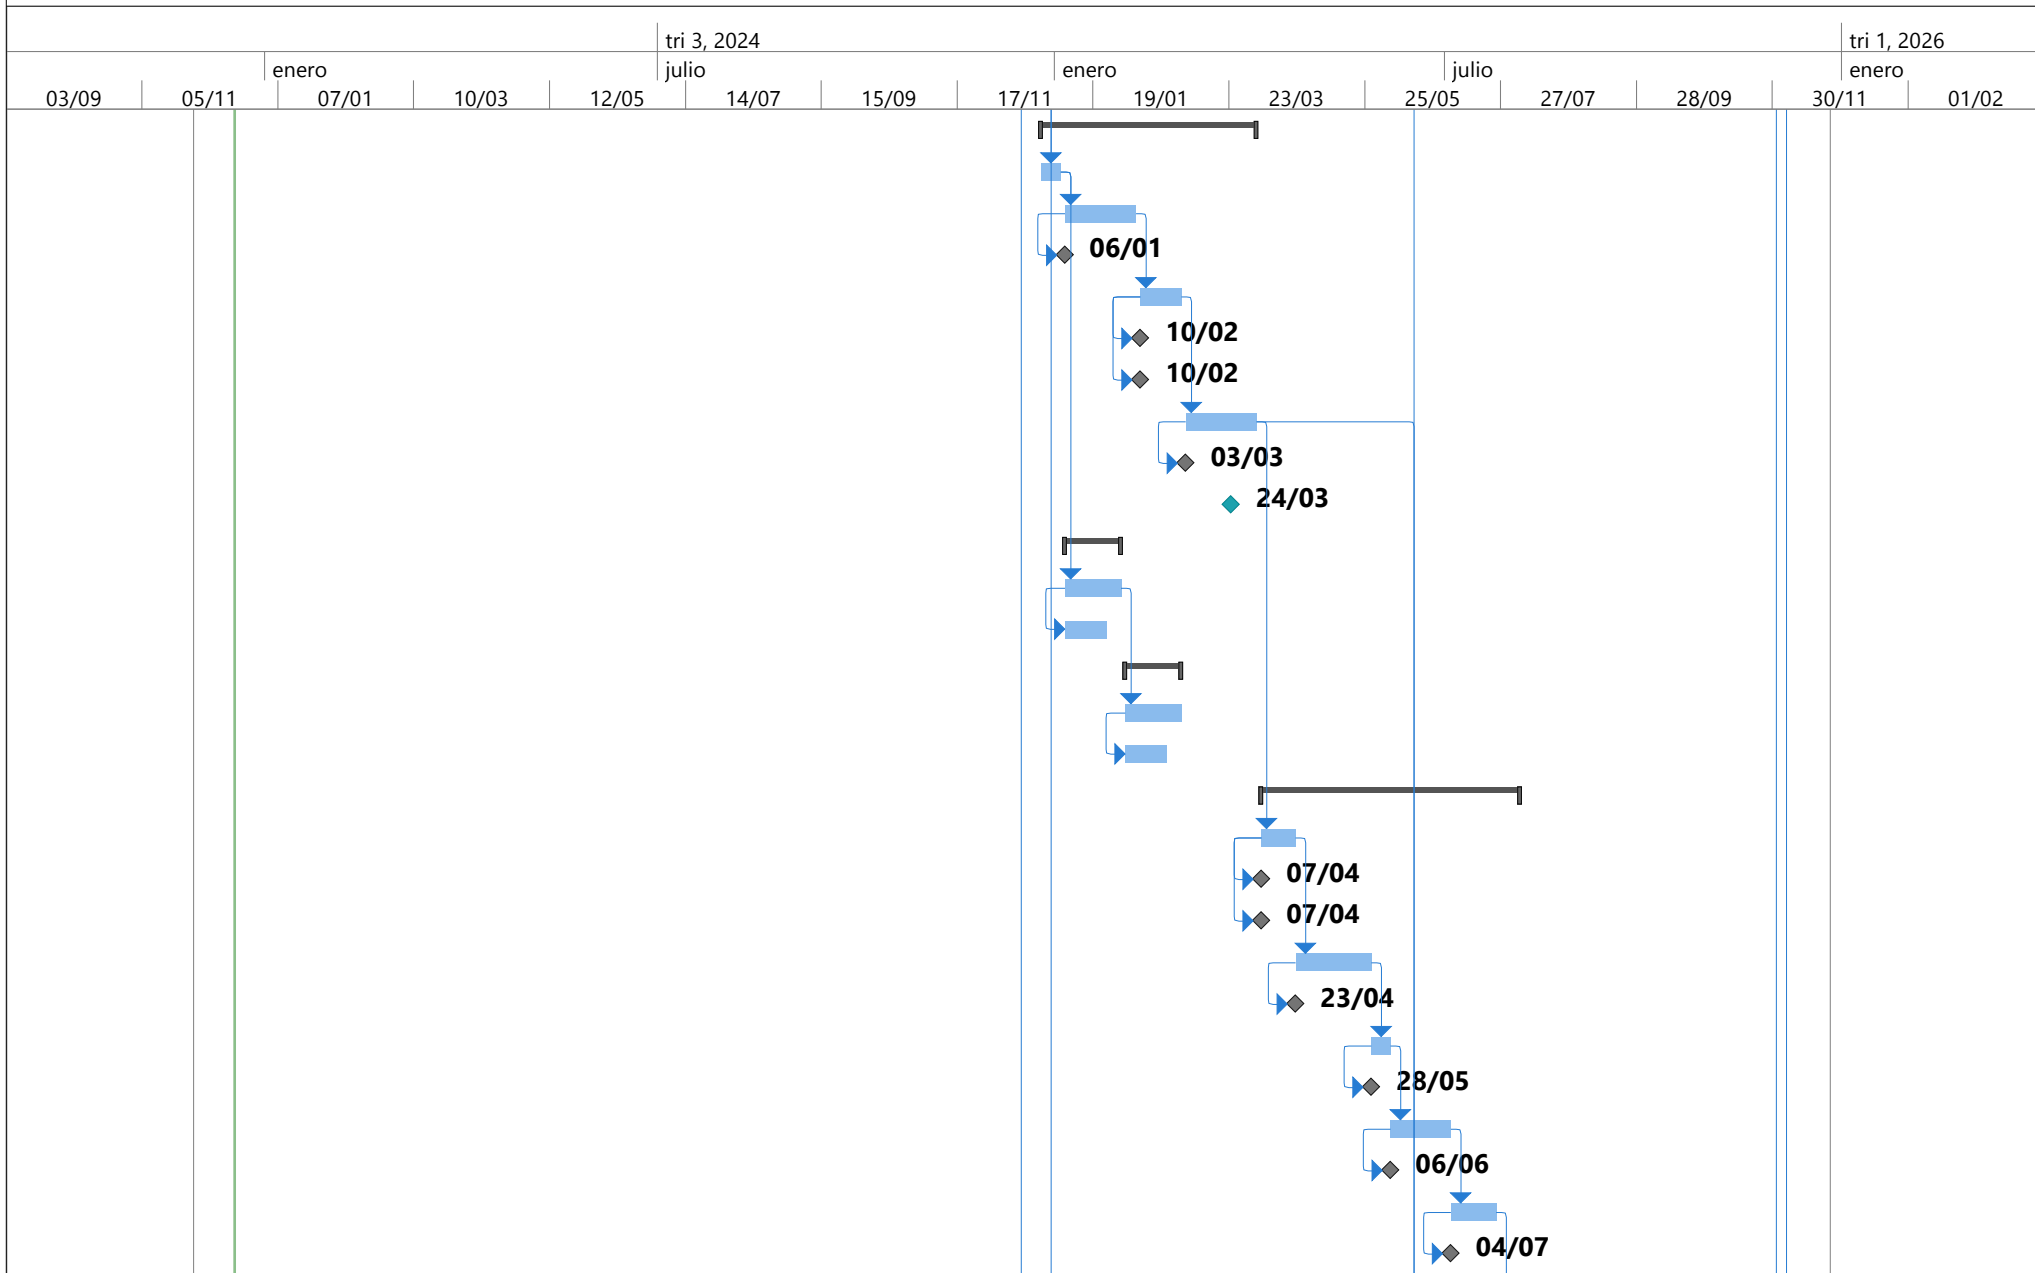


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

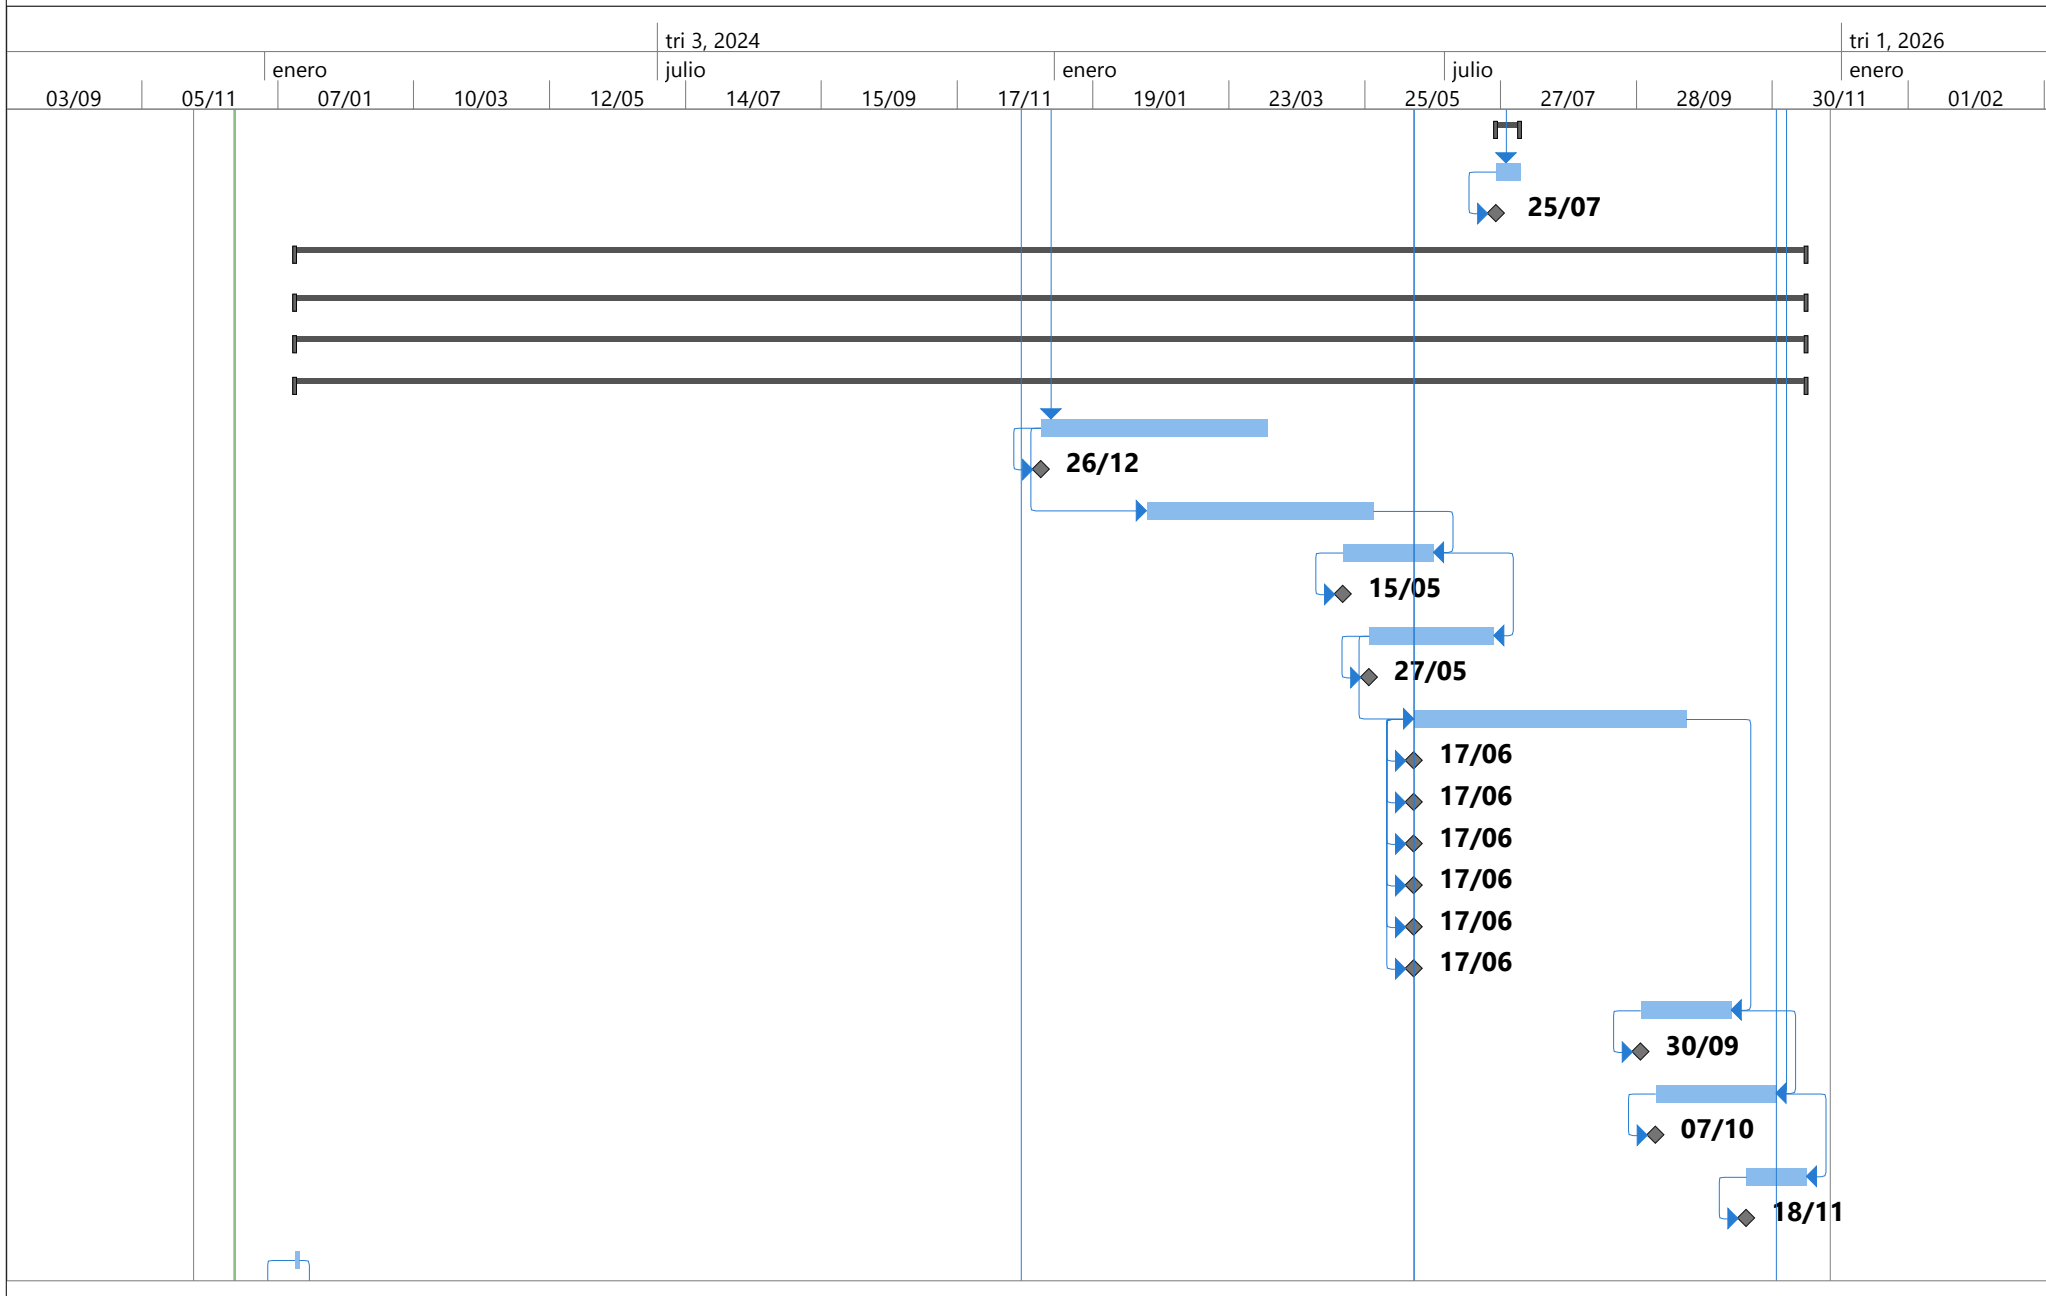


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

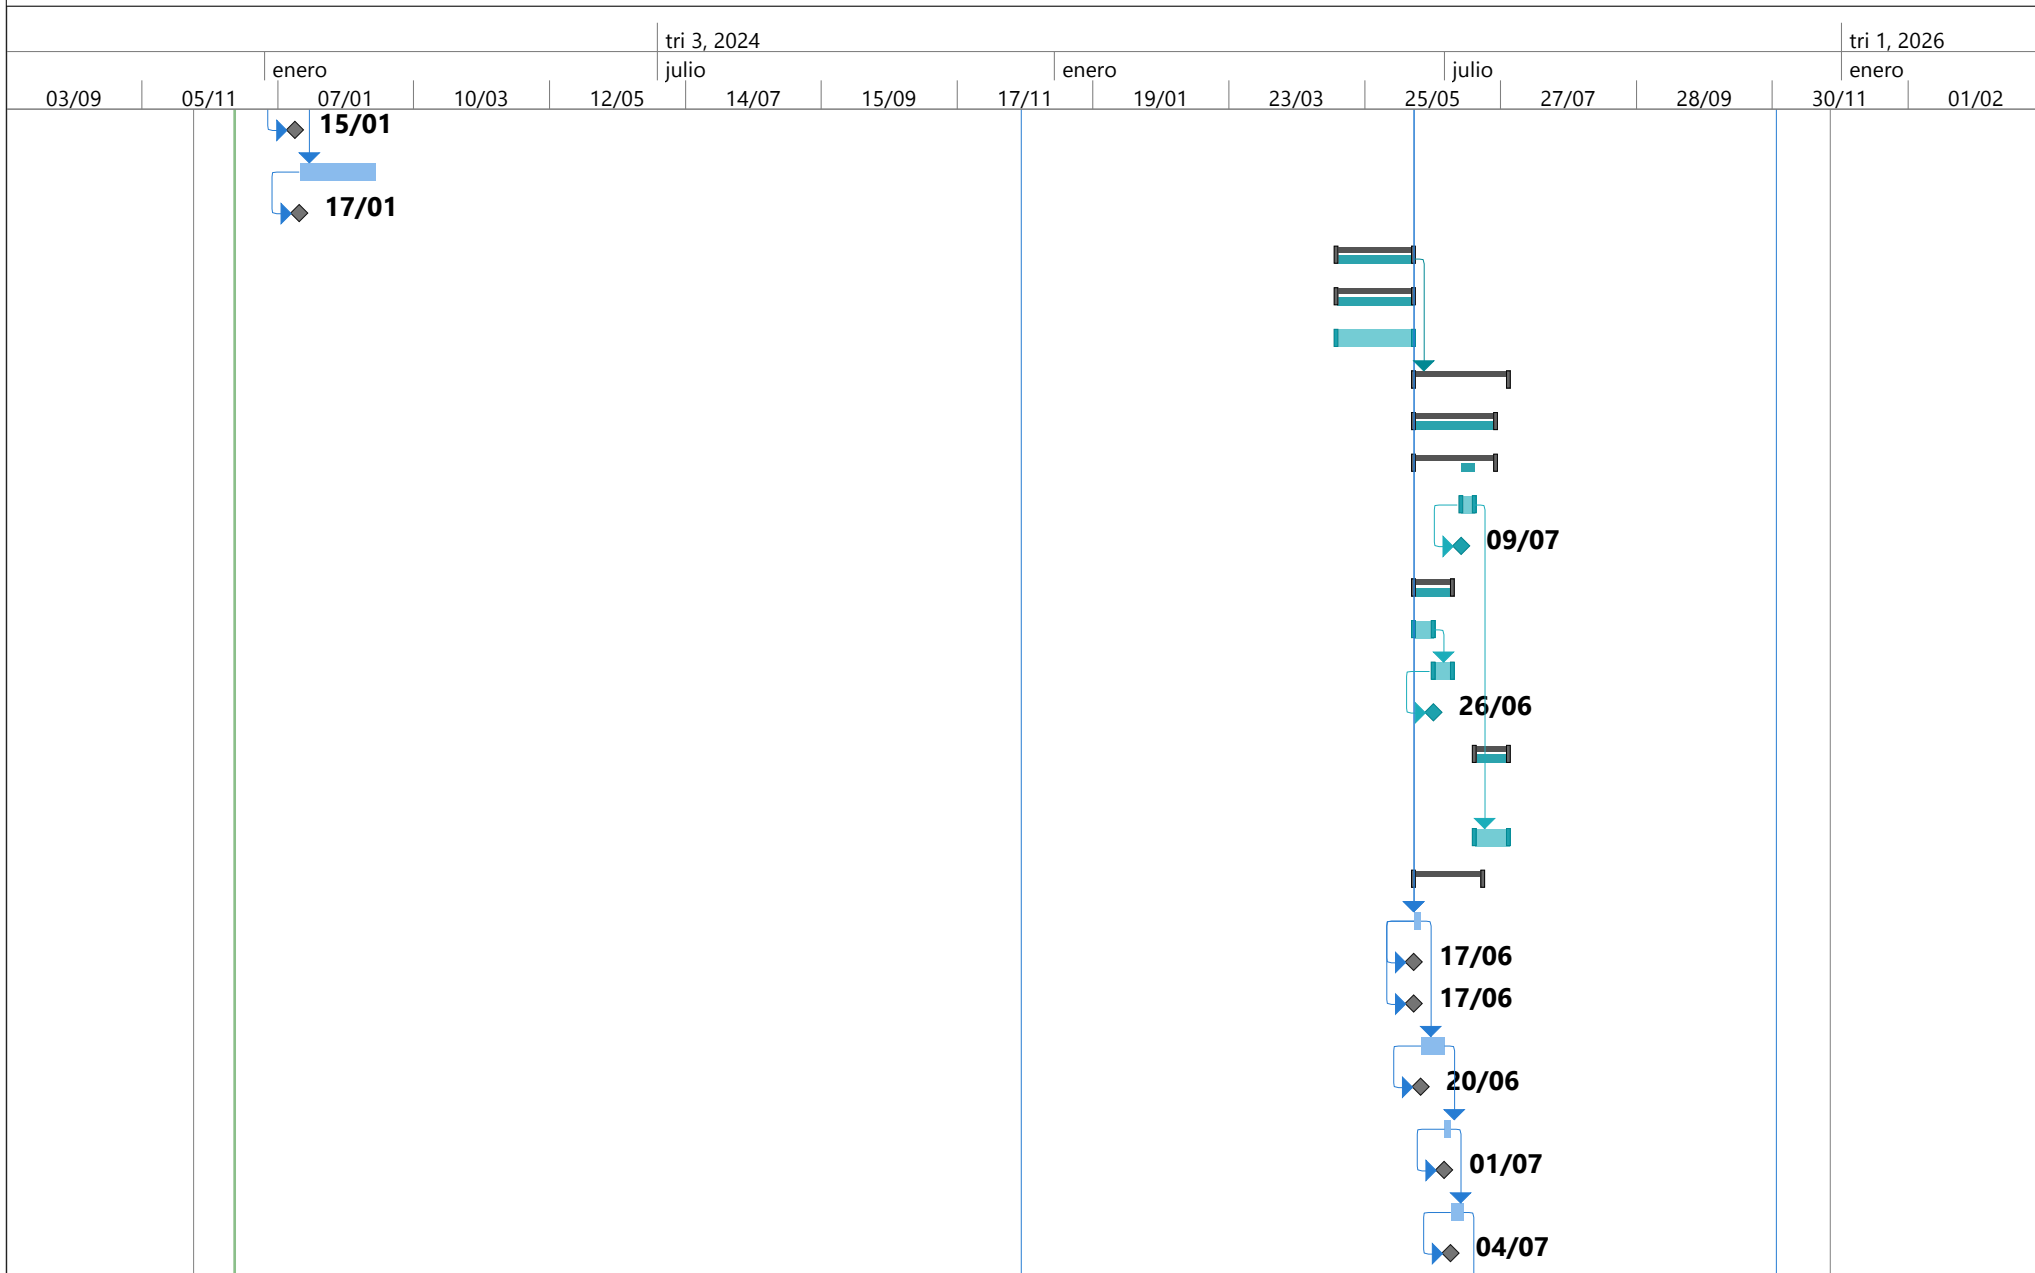


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

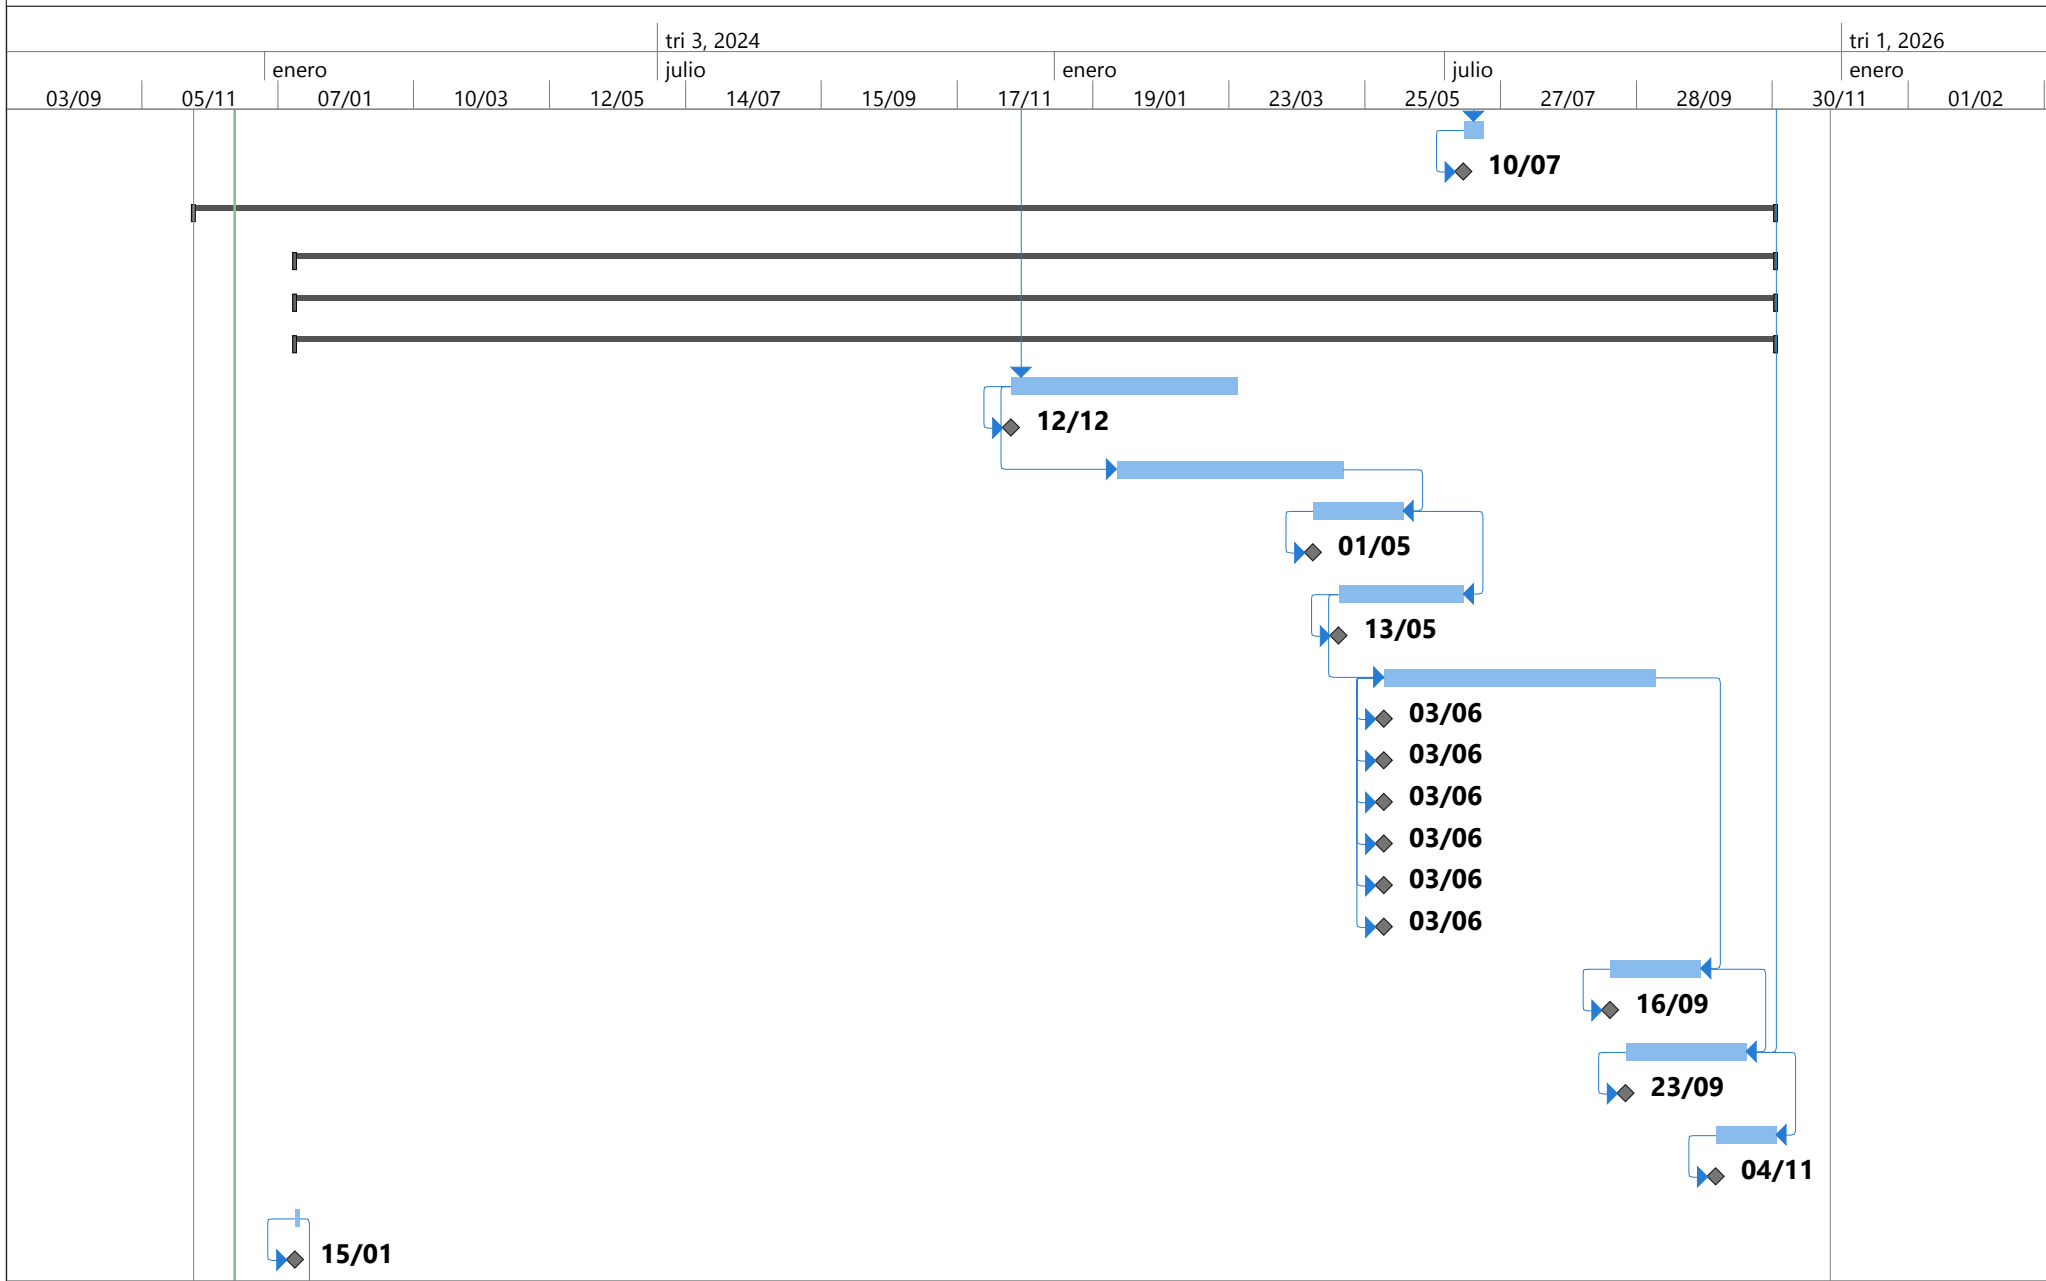


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

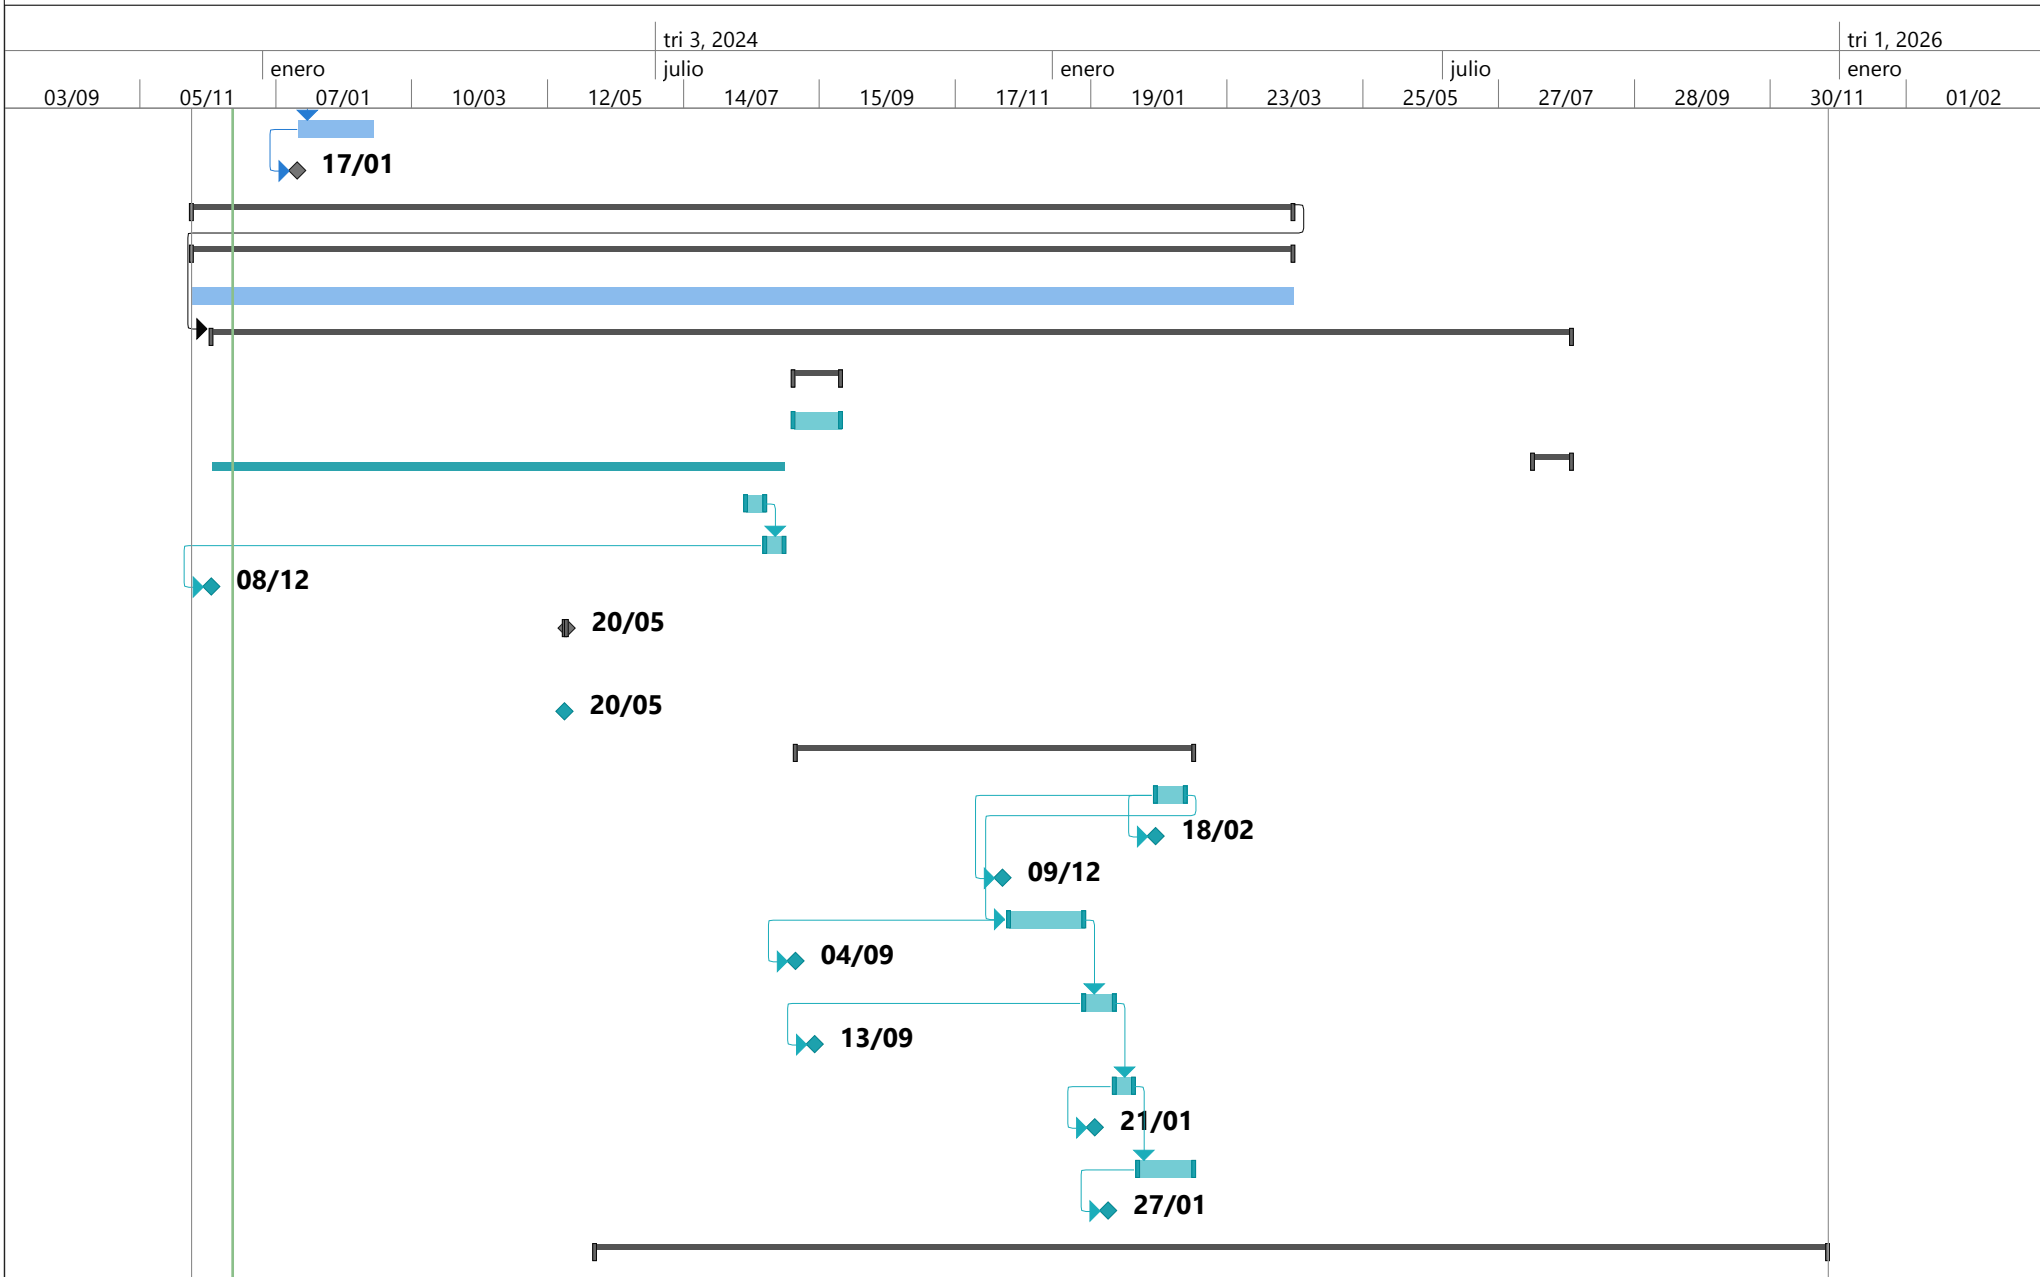


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

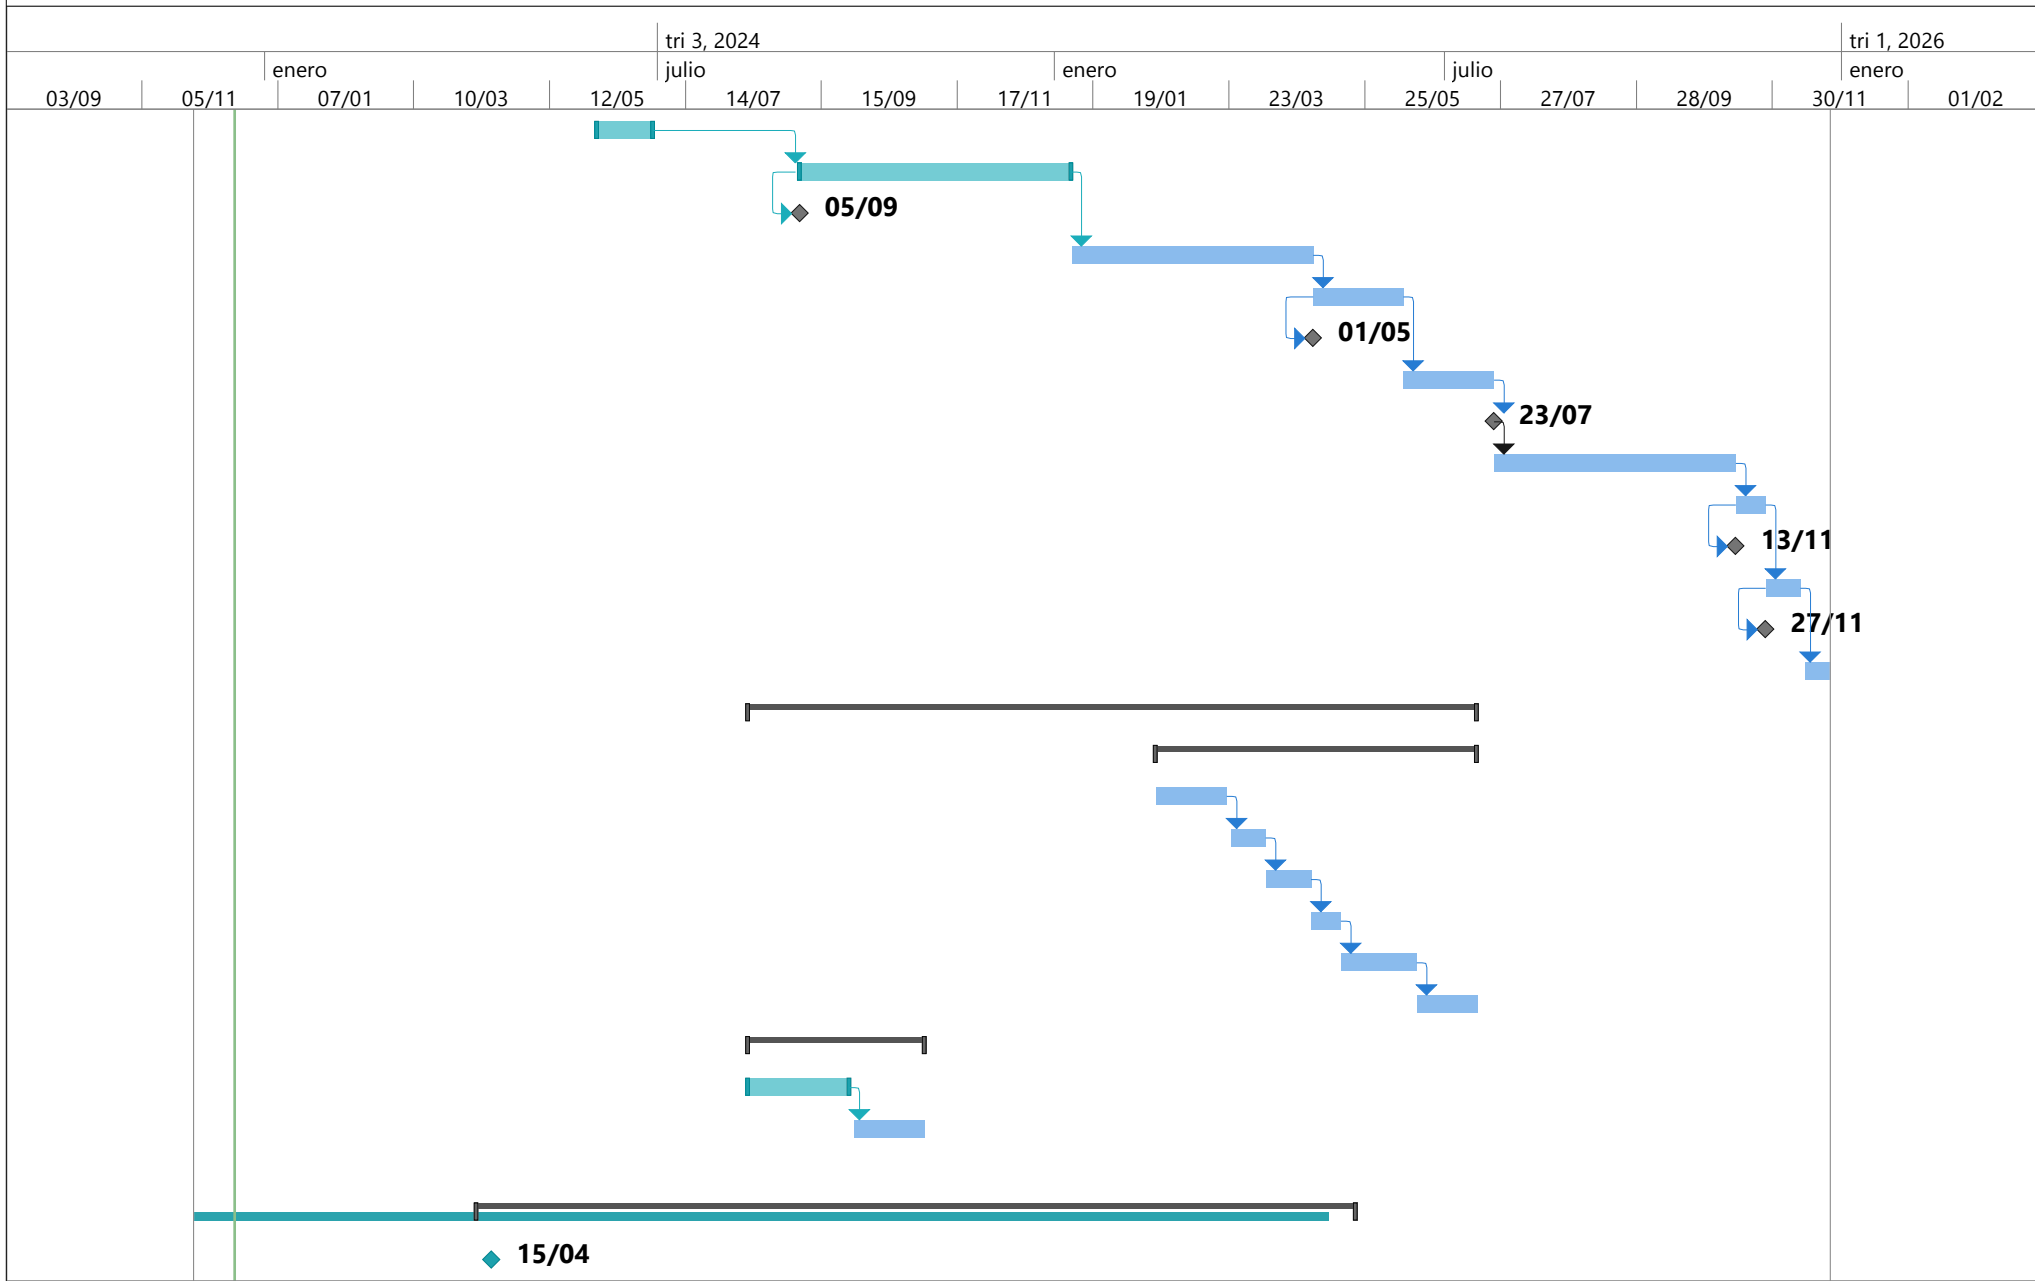

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

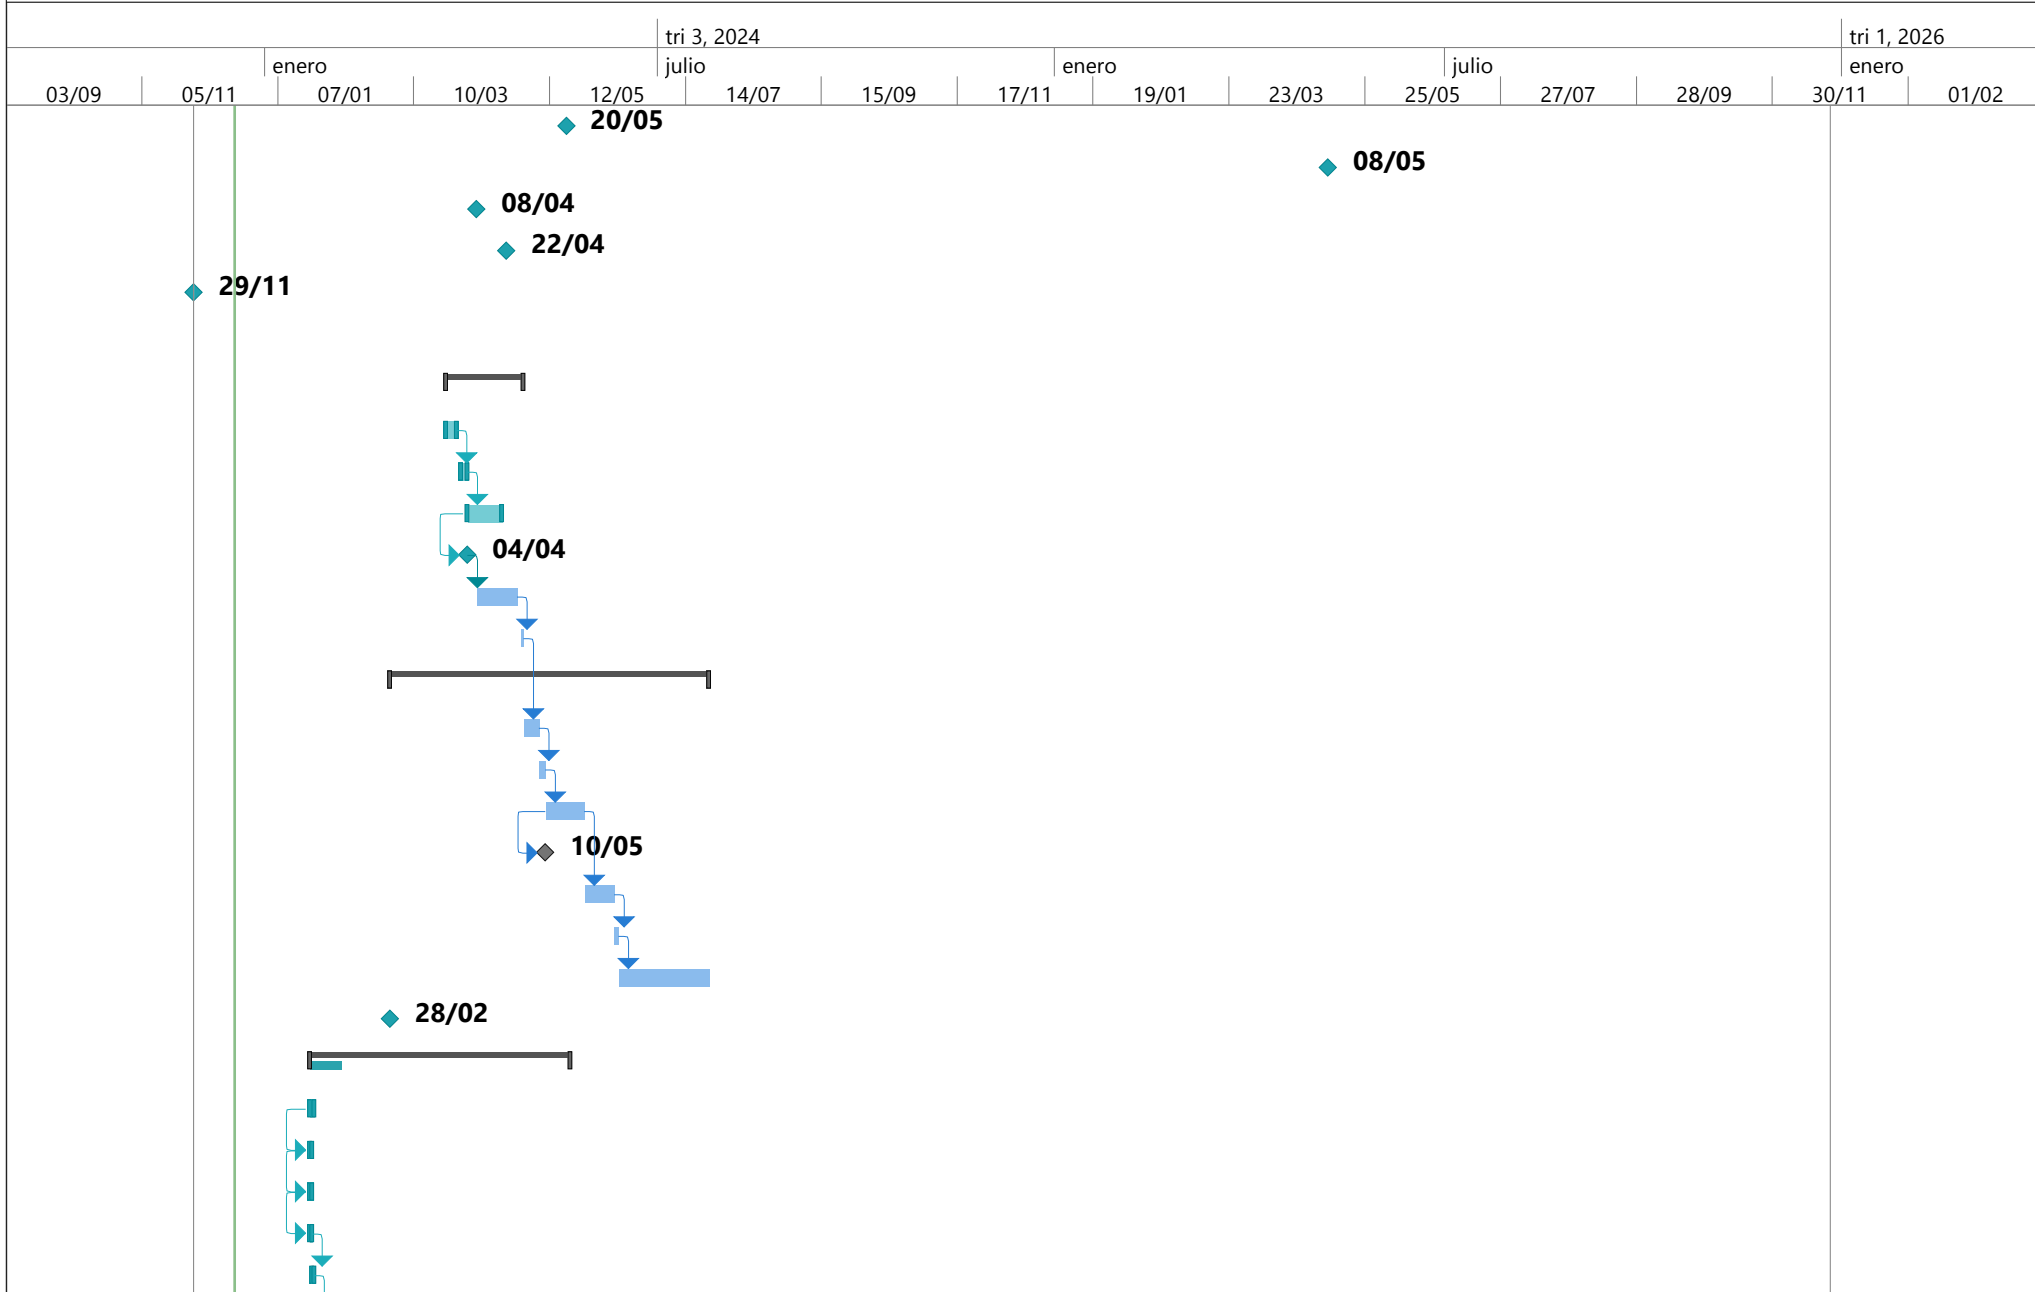

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

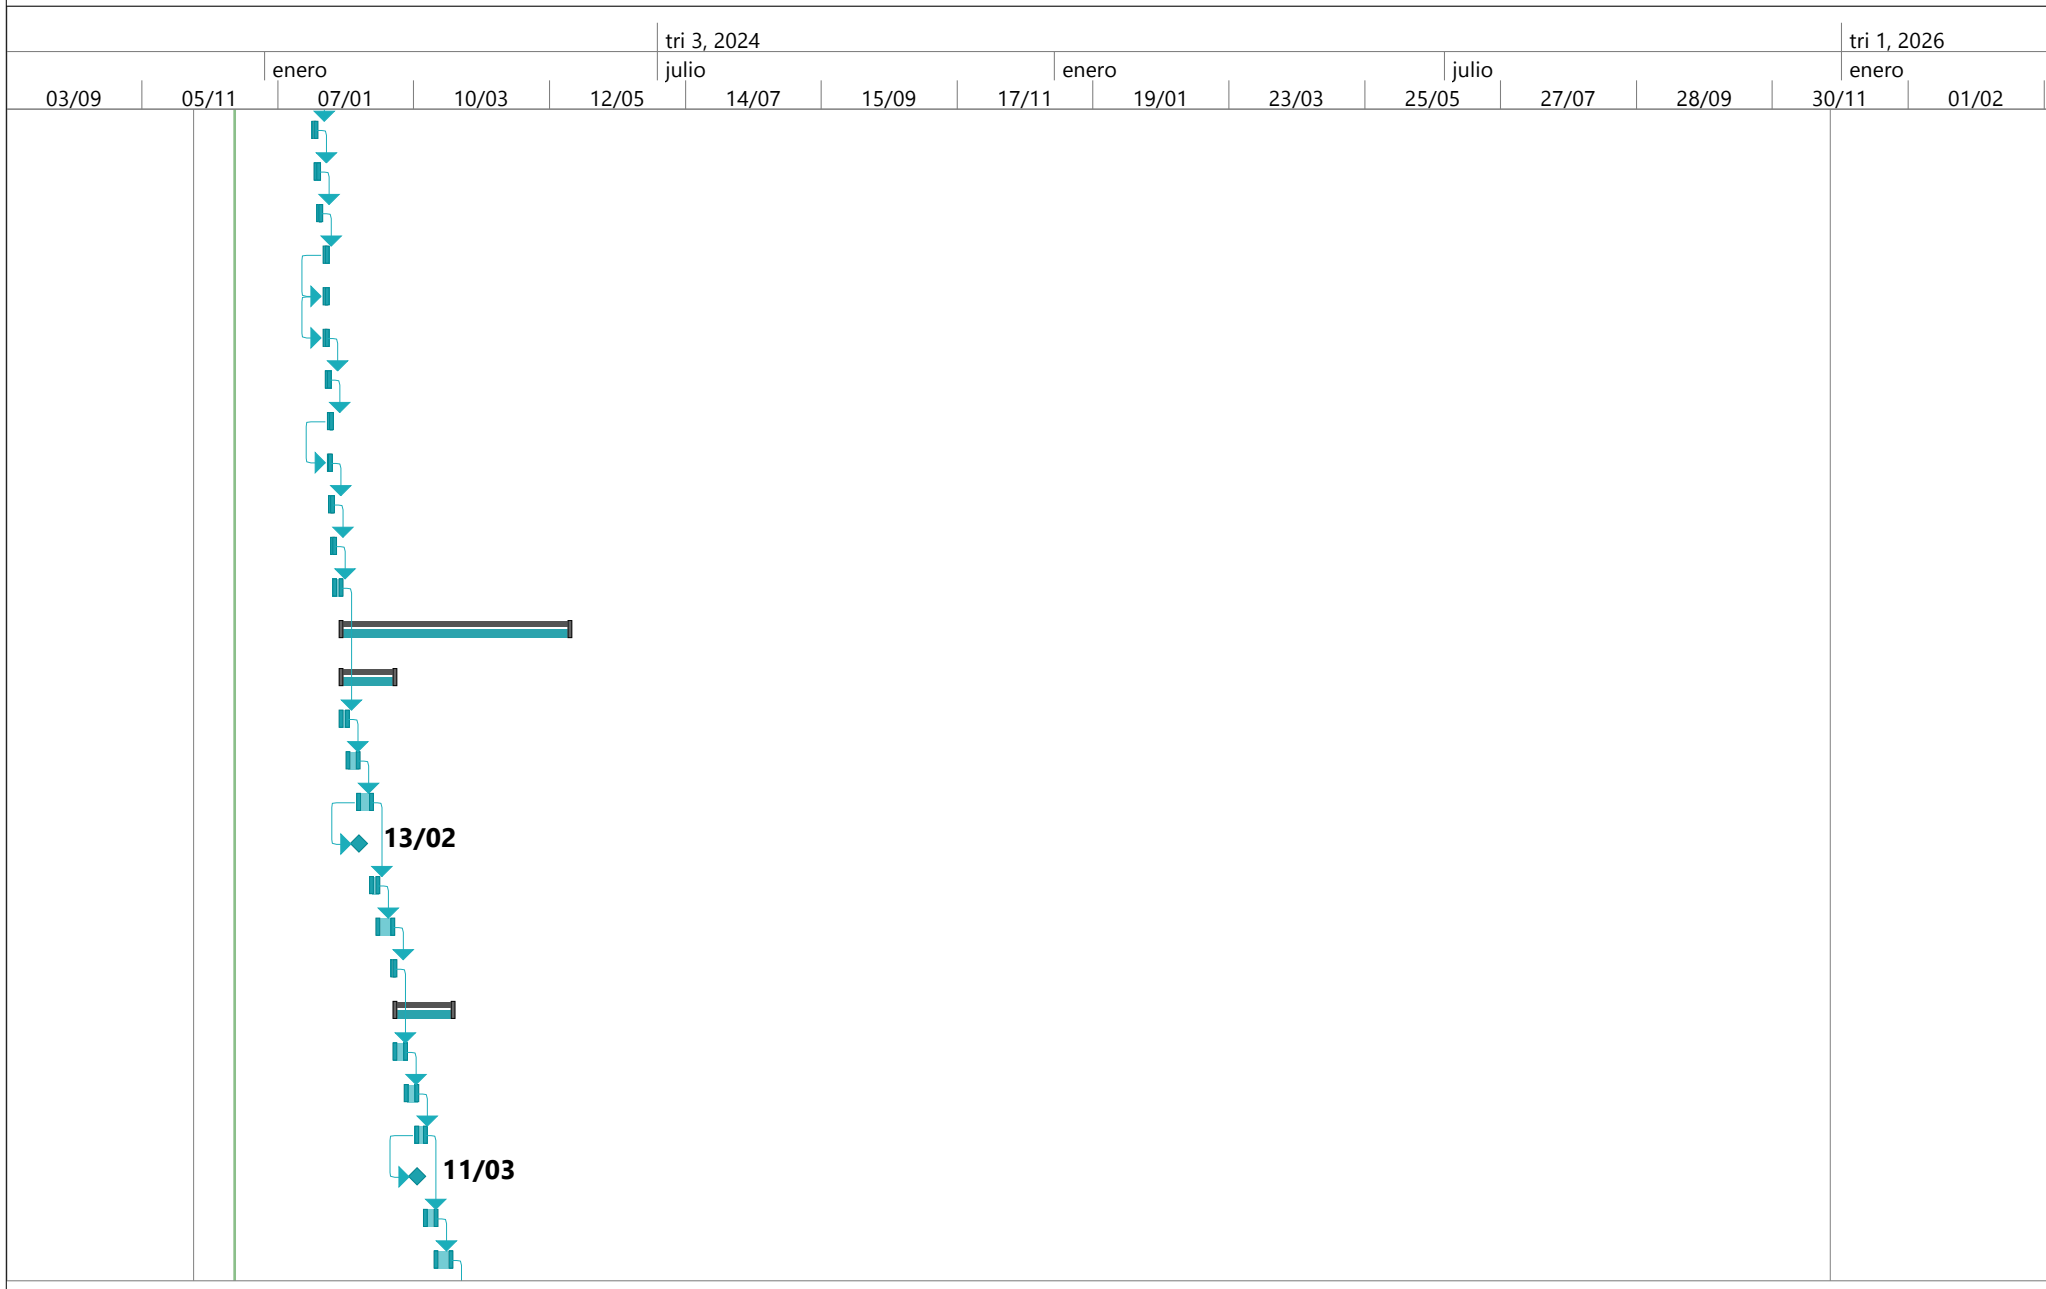


















CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)



CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Proyecto: CRONOGRAMAS 202
 Fecha: lun 18/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	
