

[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

Id	Nombre de tarea	UM	cant.	% completa	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre							
								nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
1	<b>POZO DE INFILTRACION</b>			<b>0%</b>	<b>10,5 días</b>	<b>lun 22/01/24</b>	<b>lun 05/02/24</b>								
2	Excavacion en tierra mecanizada	m3	27	0%	2 días	lun 22/01/24	mar 23/01/24								
3	Nivelacion manual de fondo y paredes de tierra	m2	4	0%	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24								
4	Encofrado sello nivelacion fondo	m2	4	0%	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24								
5	Hormigon sello nivelacion Rbk=150 kg/cm2	m3	0.4	0%	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24								
6	Encofrado lateral guarderas de fondo...24ml	m2	4	0%	1 día	mar 23/01/24	mar 23/01/24								
7	Elab. Y colocacion acero BR 12 mm	kg	18	0%	1 día	mié 24/01/24	mié 24/01/24								
8	Hgon Losa de fondo kg/cm2Rbk=250	m3	0.6	0%	1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24								
9	Colocacion muro bloque 0.20 macizado con Hgon	m2	12	0%	1 día	vie 26/01/24	vie 26/01/24								
10	Encofrado cerramento losa cubierta-...28ml	m2	14.4	0%	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24								
11	Elab. Y Colocacion de acero de 10 y 12 mm en	kg	25	0%	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24								
12	Hgon cerramento Rbk= 250 kg/cm2	m3	0.25	0%	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24								
13	Encofrado losa cubierta	m2	4	0%	1 día	mar 30/01/24	mar 30/01/24								
14	Elab. Y colocacion acero 10 y 12 mm en losa cubierta	kg	29	0%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24								
15	Hgon en losa de cubierta Rbk=250 kg-incluye insertos	m3	0.6	0%	0,5 días	mié 31/01/24	mié 31/01/24								
16	Montaje de Tapa metalica 60*60 prefabricada	u	1	0%	1 día	mié 31/01/24	jue 01/02/24								
17	Pintura asfaltica en paredes exteriores	m2	12	0%	1 día	jue 01/02/24	vie 02/02/24								
18	Rehicho mecanizado	m3	9	0%	1 día	vie 02/02/24	lun 05/02/24								
19	<b>RED SANITARIA EXTERIOR</b>			<b>0%</b>	<b>76 días</b>	<b>lun 05/02/24</b>	<b>mar 21/05/24</b>								
20	<b>RED ZONA SUR RAMAL Interior</b>			<b>0%</b>	<b>19 días</b>	<b>lun 05/02/24</b>	<b>vie 01/03/24</b>								
21	Excavacion en zanja (800*800mm)...85 ml	m3	68	0%	3 días	lun 05/02/24	jue 08/02/24								
22	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)	ml	85	0%	3 días	jue 08/02/24	mar 13/02/24								
23	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC	ml	85	0%	4 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24								
24	<b>Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC</b>	<b>ml</b>	<b>90</b>	<b>0%</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 13/02/24</b>	<b>mar 13/02/24</b>								
25	Rehicho en zanja manual	m3	60	0%	3 días	lun 19/02/24	jue 22/02/24								
26	Construccion de registros de bloques de 0.15*	u	5	0%	5 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24								
27	Colocacion de tapas de registros de hgon	u	5	0%	1 día	jue 29/02/24	vie 01/03/24								
28	<b>RED ZONA SUR RAMAL Exterior</b>			<b>0%</b>	<b>19 días</b>	<b>vie 01/03/24</b>	<b>jue 28/03/24</b>								

[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

Id	Nombre de tarea	UM	cant.	% completa	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre								
								nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
29	Excavacion en zanja (800*800mm)....120 ml	m3	96	0%	3 días	vie 01/03/24	mié 06/03/24									
30	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)	ml	120	0%	3 días	mié 06/03/24	lun 11/03/24									
31	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC	ml	120	0%	4 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24									
32	<b>Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC</b>	<b>ml</b>	<b>126</b>	<b>0%</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 11/03/24</b>	<b>lun 11/03/24</b>									
33	Rehincho en zanja manual	m3	60	0%	3 días	vie 15/03/24	mié 20/03/24									
34	Construccion de registros de bloques de 0.15*	u	10	0%	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24									
35	Colocacion de tapas de registros de hgon	u	10	0%	1 día	mié 27/03/24	jue 28/03/24									
36	<b>RED ZONA NORTE</b>			<b>0%</b>	<b>19 días</b>	<b>jue 28/03/24</b>	<b>mié 24/04/24</b>									
37	Excavacion en zanja (800*800mm)....81 ml	m3	65	0%	3 días	jue 28/03/24	mar 02/04/24									
38	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)	ml	81	0%	3 días	mar 02/04/24	vie 05/04/24									
39	Colocacion tuberia Sanitaria 110 mm PVC	ml	81	0%	4 días	vie 05/04/24	jue 11/04/24									
40	<b>Sum. Tuberia Sanitaria 110 mm PVC</b>	<b>ml</b>	<b>85</b>	<b>0%</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 05/04/24</b>	<b>vie 05/04/24</b>									
41	Rehincho en zanja manual	m3	60	0%	3 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24									
42	Construccion de registros de bloques de 0.15*	u	6	0%	5 días	mar 16/04/24	mar 23/04/24									
43	Colocacion de tapas de registros de hgon	u	6	0%	1 día	mar 23/04/24	mié 24/04/24									
44	<b>RED ZONA LINEA CENTRAL A TANQUE SEPTICO</b>			<b>0%</b>	<b>19 días</b>	<b>mié 24/04/24</b>	<b>mar 21/05/24</b>									
45	Excavacion en zanja (800*800mm)....50 ml	m3	40	0%	3 días	mié 24/04/24	lun 29/04/24									
46	Lecho de gravilla (0.8 ancho y 0.05 espesor)	ml	50	0%	3 días	lun 29/04/24	jue 02/05/24									
47	Colocacion tuberia Sanitaria 150 mm PVC	ml	50	0%	4 días	jue 02/05/24	mié 08/05/24									
48	<b>Sum. Tuberia Sanitaria 150 mm PVC</b>	<b>ml</b>	<b>53</b>	<b>0%</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 02/05/24</b>	<b>jue 02/05/24</b>									
49	Rehincho en zanja manual	m3	40	0%	3 días	mié 08/05/24	lun 13/05/24									
50	Construccion de registros de bloques de 0.15*	u	4	0%	5 días	lun 13/05/24	lun 20/05/24									
51	Colocacion de tapas de registros de hgon	u	4	0%	1 día	lun 20/05/24	mar 21/05/24									

&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre			
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar

&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre			
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar



&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre					
abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		







&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]


1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre					
dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep		

&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre						1er semestre						2º semestre					
dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep		

&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

1er semestre			2º semestre			1er semestre			2º semestre			1er semestre			2º semestre																		
oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul

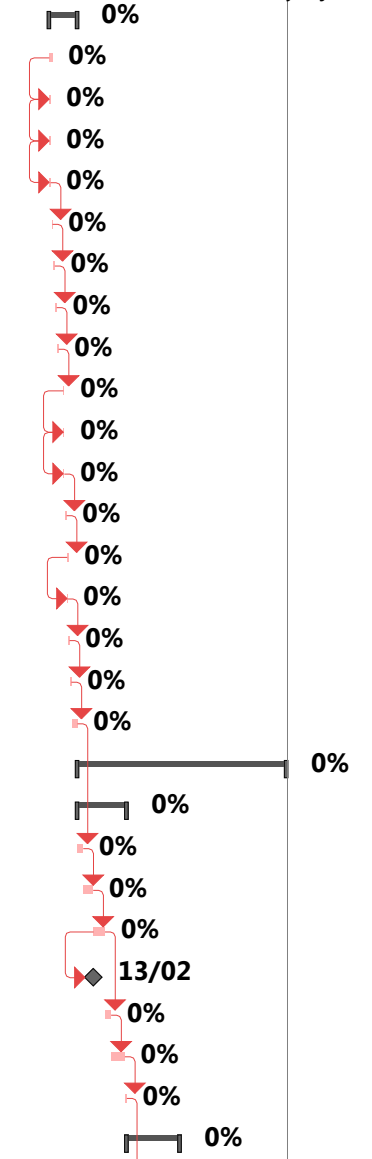

&[TANQUE SEPTICO y REDES EXTERIORES]

1er semestre			2º semestre			1er semestre			2º semestre			1er semestre			2º semestre																		
oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul

