




Proyecto de Cooperación Internacional
¡Que no baje el telón!
Componente B

Report Focal Point
Agosto 2022

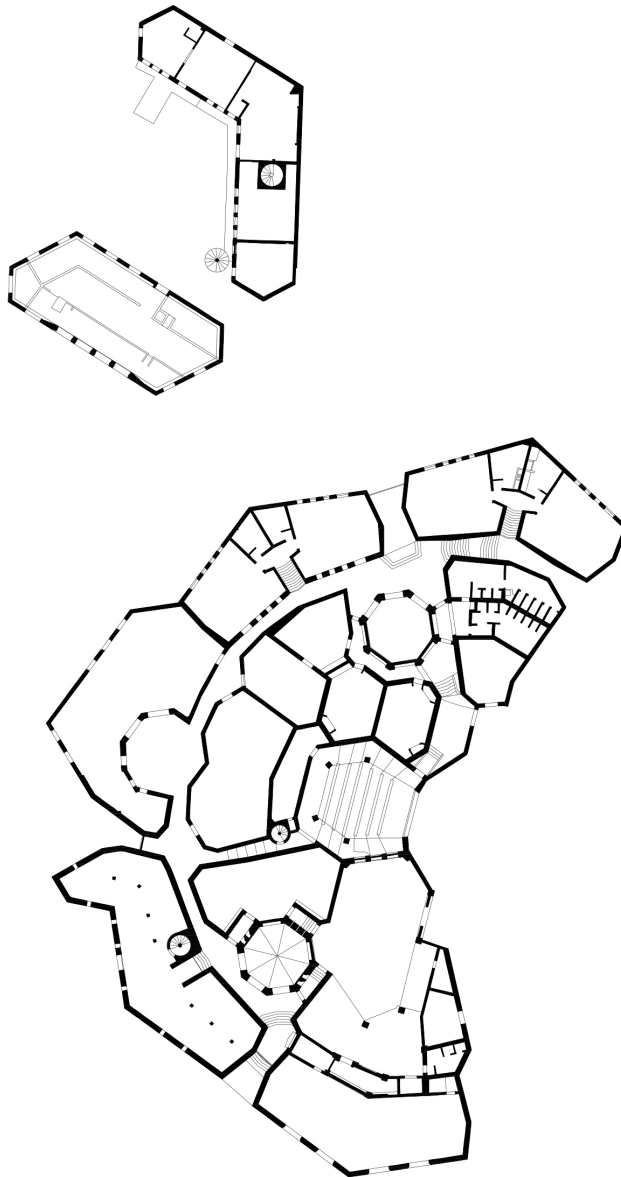

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA



isa
UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

MINISTERIO
de *Cultura*
REPÚBLICA DE CUBA



PROGETTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!
resoconto giornaliero Alessandra Basile

Data: 01.08.2022

Basile chiede informazioni a Mecca e Merlo del pagamento dei compensi per i mesi di aprile, maggio e giugno, e il rimborso spese di circa 4000€ che non sono ancora arrivati.

Data: 02.08.2022

Merlo avvisa che sono stati effettuati tutti i pagamenti.
Basile avvisa di aver appuntamento con la nuova direttrice venerdì 5 agosto.

Data: 03.08.2022

Sede: ISA
Orario: 10.00/14.00

Riunione tecnica.
Presenti Gonzalez, Hernández, PP García, Basile.

Hernández ha portato i preventivi per la sicurezza, al vaglio dell'ISA e MinCult.
Hanno rubato di nuovo il cavo per la connessione elettrica temporanea.

García ha fatto il rilievo del blocco 4 e 5 e farà il riscontro con i dati BIM ricevuti da Biagini il 22 luglio e consegnati da Basile il 28.

Prevista venerdì 5 visita ai tejares di Villa Clara e Trinidad.
Basile non potrà essere presente perché ha preso appuntamento per conoscere la nuova direttrice di Colaboración del MinCult.

Planificación física: venerdì Pedro andrà a prendere il contratto firmato per il pagamento.

Visita al cantiere:
Incontro con un responsabile del CIME. González chiede la verifica della saldatura e la calibrazione dei tensori.
Manca la verifica dei macchinari, del procedimento e il certificato del saldatore. Il contratto è già pronto.

Basile e Gonzalez si danno appuntamento al giorno dopo per la verifica degli impermeabilizzanti nel Blocco 3.



Data: 04.08.2022

Sede: ISA

Orario: 09.00/12.00

González non è presente all'appuntamento e non risponde a telefono. Basile fa montare comunque i ponteggi agli operai per salire sulle coperture del Blocco 3 e fotografare lo stato degli impermeabilizzanti.

Dopo varie ore González risponde a Basile ma è già andata via. Si accordano che Basile condividerà il report con lo stato di materiali.

Data: 05.08.2022

Basile incontra la direttrice Ana Maria Peyon al MinCult.

Spiega brevemente la situazione attuale del progetto sottolineando i seguenti temi:

1. Concludere il progetto di restauro per fare la gara completa, non solo sulle opere grigie. Lettera del Dida.
2. Reperire mattoni e rasillas. Visite a tejares, prove dei materiali e produzione
3. Sicurezza sul cantiere: rubano continuamente qualsiasi cosa.
4. Accelerare la licencia de obra.
5. Questione trasporto: trovare soluzione immediata di trasporti. Richiesta di rimborso del motorino rubato. Lettera del Dida.

La direttrice prende appunti e propone una riunione online a settembre per conoscere Mecca e Merlo. Vuole discutere dal vivo sul punto 1.

Basile avvisa tempestivamente entrambi e manda i saluti e i ringraziamenti da parte della direttrice.

Data: 19.08.2022

Merlo condivide la risposta della controparte alla lettera del DIDA e il report del secondo anno della Componente A.

Data: 23.08.2022

Solarino chiama Basile per avvisarla di una chiamata di Paradiso per organizzare una riunione in presenza con Mecca e Merlo a l'Habana. Basile non ha ricevuto nessuna comunicazione, Mecca non è al corrente.

Solarino inoltre chiede se a Basile è stato condiviso il report del secondo anno della Componente A prima di inviarlo all'AICS perché è parziale e contiene errori. Basile conferma che non hanno fatto un passaggio con il DIDA prima di inviarlo.



Data: 23.08.2022

Basile chiede a Solarino un appuntamento per discutere con Mecca e Merlo.
Solarino richiede un report schematico qualitativo sui vari aspetti del progetto per condividere le problematiche del paese sorte in questo periodo (apagones) con AICS Roma.
Appuntamento confermato il 29.

Alessandra Basile



PROGETTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!
resoconto giornaliero Alessandra Basile

Data: 29.08.2022

Riunione all'AICS

Presenti: Mecca, Merlo, Solarino, Basile

Tutto pronto per lo scambio sul teatro ma il Mincult non ha preparato i visti.
Domani Basile ne parla con Feliciano.

Sono previste due presentazioni libro:

- prato festival contemporanea. Centro Pecci.
- Roma

All'Habana ci sarà la messa in scena di Gran Glassé da fine ottobre 2022 e si presenterà al Festival di teatro a novembre 2023.

Mincult dovrà chiedere una proroga di 12 mesi.

Per il cantiere:

Bisogna dare priorità alle:

- coperture e pluviali. Le murature possono anche essere fatte dopo.
- Canalizzazioni impianti.

Fare il computo della parte di restauro è necessario.

L'ISA deve trovare fornire soluzioni ai temi di restauro quando non sono d'accordo con le proposte del DIDA: coperture, scolo acque, umidità di risalita.

Bisogna avere il dettaglio dei materiali a carico del MinCult. E quale delle partite adesso sono caricate al progetto.

Lista di punti da discutere in una riunione ufficiale. Da socializzare con l'isa e mincult.

Data: 30.08.2022

Riunione con Feliciano all'ISA

1. Piano finanziario: Basile anticipa a Feliciano di aggiornare con i materiali di restauro e il dettaglio di quali sono a carico di Mincult e quali a carico del AICS. Arriverà una comunicazione dell'AICS.
2. Organizzazione prossima riunione tecnica. Proposta 13 settembre, 9 mattina. Mecca e Merlo disponibili. Poi si cambia al 20.
3. Visti per i docenti. Basile chiede informazioni. Feliciano comunica che la nota verbal dovrebbe essere pronta in due giorni.
4. Trasporto: Feliciano riporta che è il Mincult che sta definendo la soluzione.



Feliciano inoltre aggiorna sui seguenti punti:

- è stato chiesto appoggio ad altri ministeri per supportare il progetto.
- UdG giovedì 1 settembre 10 mattina.
- 29 settembre comité coordinatore: chequeo actividades, avance atlas, avanzamento cantiere. Ci sarà la convocazione del comité direttivo da parte della nuova direttrice.
- Planificación física pagata: si sta avanzando con la licenza per microlocalización. Luis Doce chiamare per sollecitare velocità.
- Non si sono fatti ulteriori sopralluoghi ai tejares, per mancanza combustibile e apagones.

Basile visita il cantiere. Tutto è fermo.

Hernandez aggiorna che la settimana prossima sarà pronta la licenza di microlocalizzazione.

Hanno rubato ancora al laboratorio di saldatura.

Basile non riesce a incontrare González che le da appuntamento alla settimana prossima.

Data: 31.08.2022

Basile condivide con Mecca e Merlo la bozza di documento di rapporto intermedio sollecitato da AICS.

Data: 01.09.2022

Basile condivide con Mecca e Merlo i punti da discutere alla riunione UdG:

1. Aggiornamento computo metrico con la componente di restauro
2. Aggiornare preventivo dei costi seguendo lo schema del piano finanziario del POG
3. Programma di gestione tempi e costi e forniture
4. Risolvere il problema della sicurezza sul cantiere (furti) e trovare un magazzino sicuro per i futuri acquisti
5. Risoluzione del trasporto: in sospeso il trasporto per Basile e la gara per i veicoli.

Basile si reca all'ISA per la riunione UdG ma Feliciano ha il dengue e non è stata avvertita della cancellazione della riunione.

C'è il black out all'ISA. Torna a casa.

Invio loghi progetto e revisione traduzione testo per l'evento a Prato.

Data: 02.09.2022

Cano non ha ancora ricevuto la nota verbale. Basile chiama Oliver, Cano e scrive a Feliciano per ottenere informazioni sulla procedura. Feliciano garantisce che è una procedura semplice e che per lunedì martedì sarà pronta. Chiede a Basile di scrivere a del Federico per l'appuntamento. Basile invia a del Federico i documenti dei tre docenti per la richiesta visto.
